### 北陸新幹線(金沢・敦賀間)工程・事業費の概況



令和4年7月時点

#### 1. 全体工程及び事業費


- 土木工事から軌道等の設備工事に全工区引渡し済み。
- ・<u>全線で軌道スラブ敷設が完了する等、</u>設備(軌道・機械・建築・電気)工事は、 設定された工期内で進捗している。
- ・事業費総額は、認可の範囲内である。


#### 2. 敦賀駅

・建築工事は設定された工期内で進捗している。(令和4年7月19日現地確認)

#### 3. その他

- ・新型コロナウイルスについて、<u>6月22日から7月19日の間で12件の感染が</u> <u>確認された</u>が、全体工程への影響なし。
- ・加賀トンネルについて、引き続き経過観察を行う。

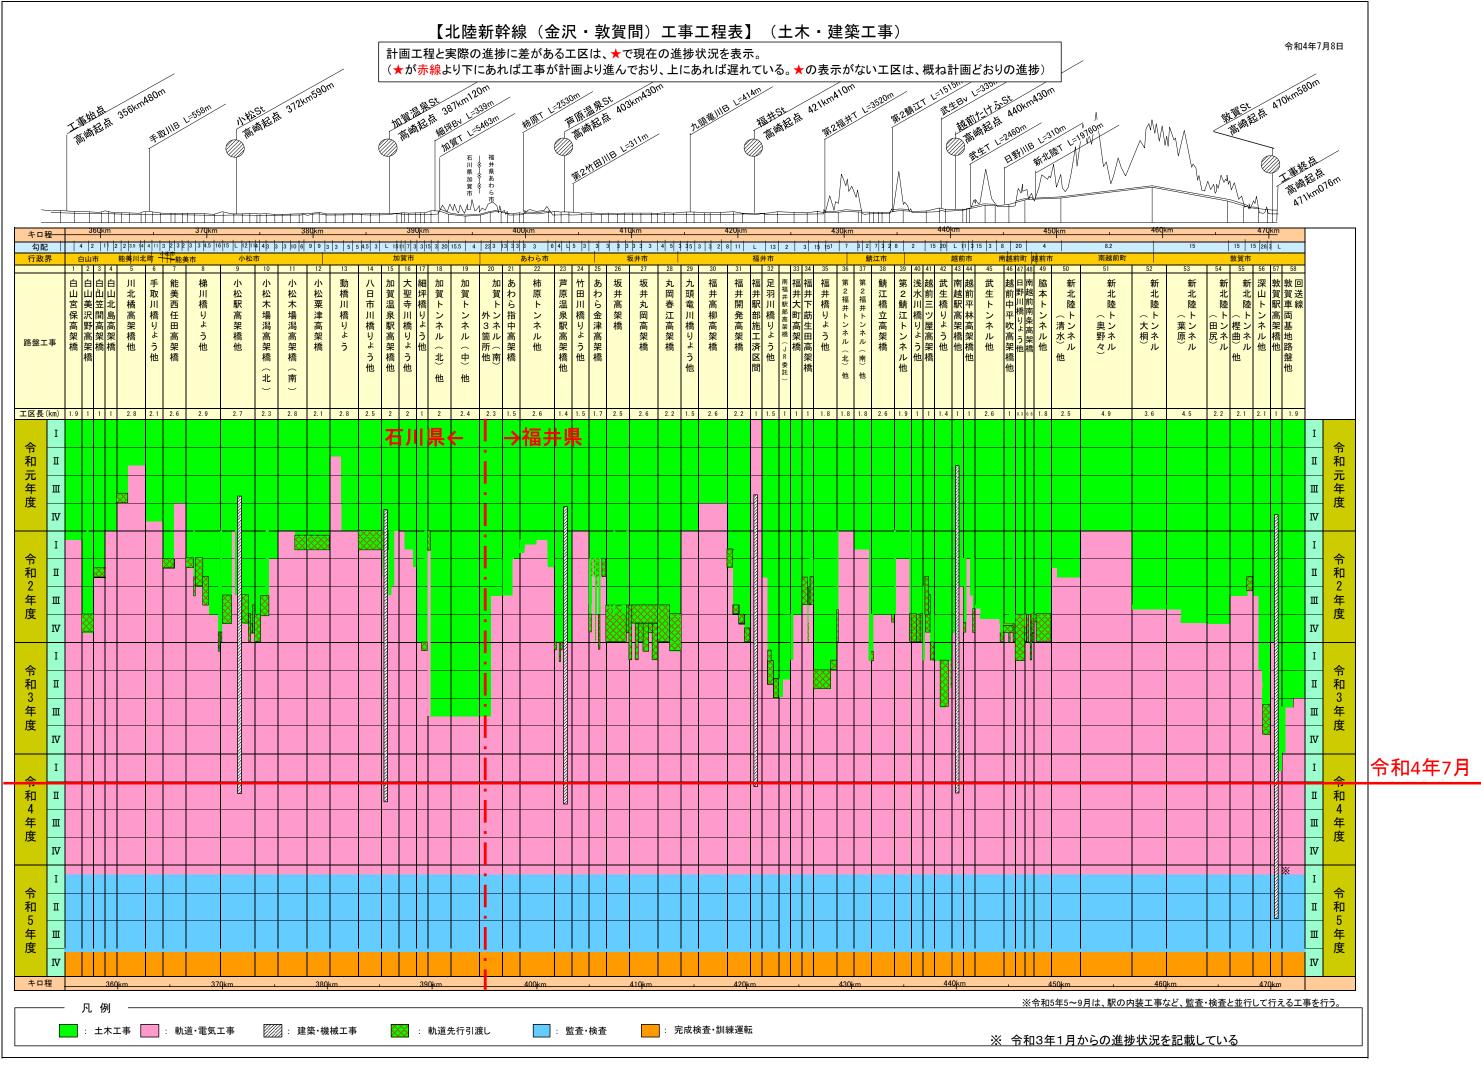

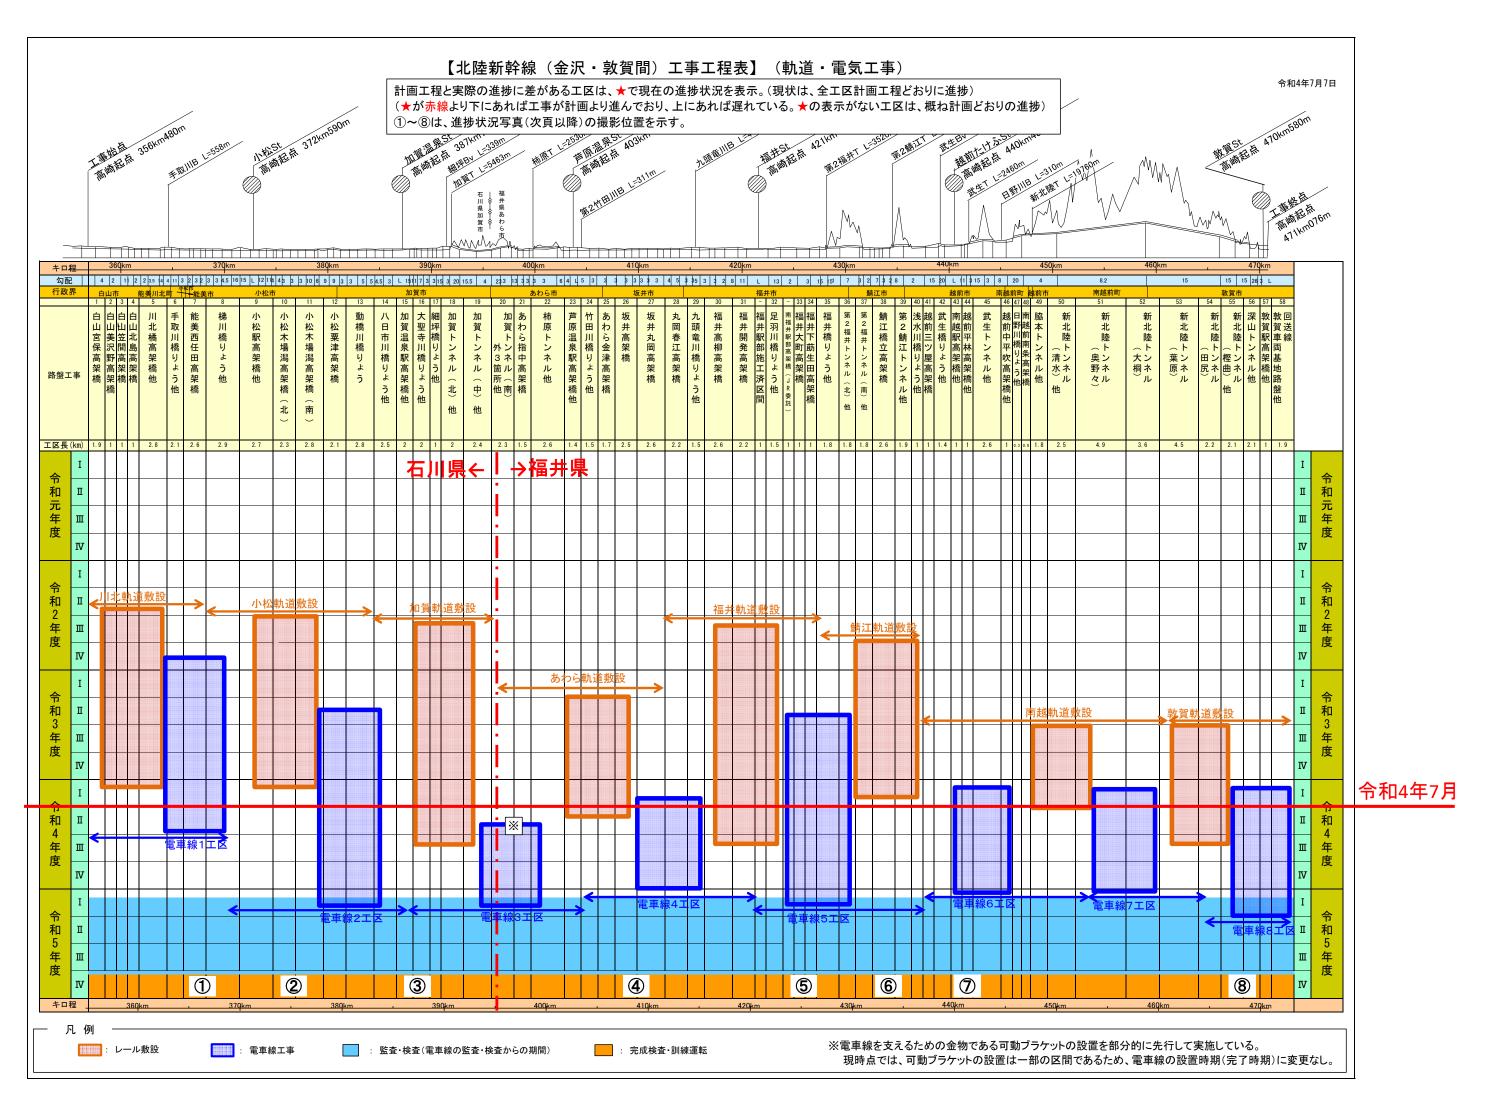

## 設備工事進捗状況



### ⑤ 福井軌道敷設/電車線5工区(令和4年6月時点)





福井県福井市より敦賀方を撮影 軌道工事は、左側(下り)で軌道スラブを敷設中、 右側(上り)で仮軌道の敷設を完了 電気工事は、電柱を設置

### ⑧ 敦賀軌道敷設/電車線7・8工区(令和4年6月時点)



福井県敦賀市より敦賀方を撮影 軌道工事は、両側(上り・下り)でレール敷設中 電気工事は、電柱を設置



### 令和4年7月時点




福井県福井市より敦賀方を撮影 軌道工事は、両側(上り・下り)で軌道スラブを敷設完了 電気工事は、電柱を設置

令和4年7月時点



福井県敦賀市より敦賀方を撮影 軌道工事は、両側(上り・下り)でレール敷設中 電気工事は、両側(上り・下り)で変電所からの電気を供給する き電線を設置

# 設備工事進捗状況(駅工事その1)



### 小松駅

・令和4年8月建築工事完了予定であり、引き続き機械工事等を進める。



駅正面

ホーム階 (エスカレーター付近)▶



▲下りホーム 可動式ホーム柵据付

1階コンコース (改札付近)▶





### 加賀温泉駅

令和4年7月

・令和4年9月建築工事完了予定であり、引き続き機械工事等を進める。



駅正面

ホーム階 (エスカレーター付近) ▶




▲西部消雪基地 地下タンク据付

1階コンコース (改札付近)





# 設備工事進捗状況(駅工事その2)



## 芦原温泉駅

・令和4年9月建築工事完了予定であり、引き続き機械工事等を進める。



駅全景

### ホーム階▶



▲下りホーム エスカレーター

2階コンコース (改札付近)






## 福井駅

令和4年7月

・令和4年8月建築工事完了予定であり、引き続き機械工事等を進める。



駅正面






▲駅西部 消雪配管搬入(高架上) 1階コンコース▶





# 設備工事進捗状況(駅工事その3)



## 越前たけふ駅

・令和4年9月建築工事完了予定であり、引き続き機械工事等を進める。




駅正面

# ホーム階 (エスカレーター付近) ▶



▲上りホーム 可動式ホーム柵据付







## 敦賀駅

令和4年7月

・令和5年秋頃建築工事完了予定であり、引き続き機械工事等を進める。



駅全景





▲東口棟 エスカレーター

東口棟▶





### 各工区の工事進捗状況一覧表

2 白山美 3 白山笠 4 白山加 5 川北林 6 手取川 7 能美型 8 梯川林 9 小松馴	工区名 宮保高架橋 美沢野高架橋 笠間高架橋 北島高架橋 北島高架橋	土木 完了予定 (R4.6) R2.4末 R2.12末 R2.7末 R2.3末 R1.12末 R2.2末 R2.6末 R2.12末	エ事 完了予定 (R4.7) R2.4末 R2.12末 R2.7末 R2.3末 R1.12末 R2.2末 R2.6末 R3.2末	開始時期※1 R2.6初 R3.2初 R2.9初 R2.4初 R1.11中 R2.11中 R2.3初 R2.9中	就道·電気工事 完了予定※2 (R4.6)	完了予定※2 (R4.7)	開始時期	主	完了予定 (R4.7) — — —	開始予定※3時期	検査・訓練運 ⇒開業 完了予定 (R4.6)	完了予定 (R4.7)	備考
2 白山美 3 白山笠 4 白山加 5 川北林 6 手取川 7 能美型 8 梯川林 9 小松馴	美沢野高架橋 笠間高架橋 北島高架橋 北島高架橋他 川橋りょう他 西任田高架橋 橋りょう他 駅高架橋他 駅高架橋他	R2.4末 R2.12末 R2.7末 R2.3末 R1.12末 R2.2末 R2.6末 R2.12末	R2.4末 R2.12末 R2.7末 R2.3末 R1.12末 R2.2末 R2.2末	R2.6初 R3.2初 R2.9初 R2.4初 R1.11中 R2.11中	(R4.6)	(R4.7)	- - - -	(R4.6)	(R4.7) — — —	時期	(R4.6)	(R4.7)	
2 白山美 3 白山笠 4 白山加 5 川北林 6 手取川 7 能美型 8 梯川林 9 小松馴	美沢野高架橋 笠間高架橋 北島高架橋 北島高架橋他 川橋りょう他 西任田高架橋 橋りょう他 駅高架橋他 駅高架橋他	R2.12末 R2.7末 R2.3末 R1.12末 R2.2末 R2.6末 R2.12末	R2.12末 R2.7末 R2.3末 R1.12末 R2.2末 R2.6末	R3.2初 R2.9初 R2.4初 R1.11中 R2.11中	· R4.8中	R4.8中	- - -	_ 	-				
3 白山笠 4 白山却 5 川北楠 6 手取川 7 能美西 8 梯川林 9 小松馴	笠間高架橋 北島高架橋 橋高架橋他 川橋りょう他 西任田高架橋 橋りょう他 駅高架橋他 木場潟(北)高架橋	R2.7末 R2.3末 R1.12末 R2.2末 R2.6末 R2.12末	R2.7末 R2.3末 R1.12末 R2.2末 R2.6末	R2.9初 R2.4初 R1.11中 R2.11中	· R4.8中	R4.8中	_ 	-	_				
4 白山 <sup>1</sup> 5 川北 <sup>4</sup> 6 手取川 7 能美西 8 梯川 <sup>4</sup> 9 小松 10 小松 <sup>4</sup>	北島高架橋 橋高架橋他 川橋りょう他 西任田高架橋 橋りょう他 駅高架橋他 木場潟(北)高架橋	R2.3末 R1.12末 R2.2末 R2.6末 R2.12末	R2.3末 R1.12末 R2.2末 R2.6末 R3.2末	R2.4初 R1.11中 R2.11中	R4.8中	R4.8中		_					
5 川北 6 手取川 7 能美 8 梯川 9 小松 10 小松	橋高架橋他 川橋りょう他 西任田高架橋 橋りょう他 駅高架橋他 木場潟(北)高架橋	R1.12末 R2.2末 R2.6末 R2.12末 R3.2末	R1.12末 R2.2末 R2.6末 R3.2末	R1.11中 R2.11中 R2.3初	· R4.8中	R4.8中	_		_				
6 手取川 7 能美西 8 梯川福 9 小松剔	川橋りょう他 西任田高架橋 橋りょう他 駅高架橋他 木場潟(北)高架橋	R2.2末 R2.6末 R2.12末 R3.2末	R2.2末 R2.6末 R3.2末	R2.11中 R2.3初				_					
7 能美型 8 梯川林 9 小松園 10 小松オ	西任田高架橋 橋りょう他 駅高架橋他 木場潟(北)高架橋	R2.6末 R2.12末 R3.2末	R2.6末 R3.2末	R2.3初			_		_				
8 梯川林 9 小松馴 10 小松才	橋りょう他 駅高架橋他 木場潟(北)高架橋	R2.12末 R3.2末	R3.2末					ı	-				
9 小松馬10 小松才	駅高架橋他 木場潟(北)高架橋	R3.2末		R2.9中			_	-	-				
10 小松才	木場潟(北)高架橋		R3.2末				_	1					
		R2.12末		R3.3初			R2.9末	R5.4末	R5.4末				
11 小松木	木場潟(南)高架橋		R2.12末	R2.6中			_	-					
		R2.4中	R2.4中	R2.5初		R4.12上	_	_	_			R6.3末	
12 小松粟	粟津高架橋	R2.4中	R2.4中	R2.6初	R4.12上		_	_	_				
13 動橋川	川橋りょう他	R2.3末	R2.3末	R2.5中			_	_	1				
14 八日市	市川橋りょう他	R2.3末	R2.3末	R2.6初			_	_					
15 加賀温	温泉駅高架橋他	R2.10末	R2.10末	R2.6初	<del></del> 刃		R2.10中	R5.4末	R5.4末				
16 大聖寺	寺川橋りょう他	R2.7末	R2.7末	R2.8初		R4.12末	_	_	_				
17 細坪棉	橋りょう他	R3.3末	R3.3末	R3.7初			_	_	_				
18 加賀ト	トンネル(北)他	R3.10末	R3.10末	R3.2初			_		ı	R5.5初	R6.3末		
19 加賀ト	トンネル(中)他	R3.10末	R3.10末	R3.1中			_	I	ı				
20 加賀ト	トンネル(南)外3か所他	R3.11末	R3.11末	R2.7中	R4.12末		_	_					
21 あわら	ら指中高架橋	R2.10末	R2.10末	R2.8初	_		_	_	_				
22 柿原ト	トンネル他	R2.7末	R2.7末	R2.7初			_	_	_				
23 芦原温	温泉駅高架橋他	R3.3末	R3.3末	R3.4初			R2.9初	R5.4末	R5.4末				
24 竹田川	川橋りょう他	R2.3末	R2.3末	R3.3下			_	_	_				
25 あわら	ら金津高架橋	R2.12末	R2.12末	R3.1初			_	_	_				
26 坂井高	高架橋	R2.12末	R2.12末	R3.1初			_	_	_				
27 坂井丈	丸岡高架橋	R2.11末	R2.11末	R3.1初			_	-					
28 丸岡君	春江高架橋	R2.12末	R2.12末	R3.2初	D444±	R4.11末 -	_	_	_				
29 九頭竜	竜川橋りょう他	R2.3末	R2.3末	R2.4初	R4.11末		_	_					
30 福井高	高柳高架橋他	R1.12末	R1.12末	R2.2中	2.2中		_	_	_				
31 福井開	開発高架橋	R3.2中	R3.2中	R2.7中			_	Ī				-	
福井駅	駅高架橋他	_	_	R3.3中			R2.4上	R5.4末	R5.4末				
32 足羽川	川橋りょう他	R3.7末	R3.7末	R3.3中			_	_	_				
南福井	井駅部高架橋(JR委託)	R3.9末	R3.9末	R3.7初	R4.12中	R4.12中	_	_	_				
33 福井大	大町高架橋	R3.5末	R3.5末	R3.1下			_		ı				

<sup>※1:</sup>土木工事が一部区間を先行して引渡しを行っている。

<sup>※2:</sup>完了予定及び完了見込は、電車線の監査・検査に関する工事が完了した時期

<sup>※3:</sup>電車線の監査・検査からの期間であり、全線を通して実施する予定。

## 各工区の工事進捗状況一覧表

(凡例)		
完了した工区	計画より進んでいる工区	計画より遅延が生じている工区
現在工事中の工区	計画通りもしくは調整済みの工区	全体工程に影響を及ぼす遅延が生じている工区
※ 土木工事において、本体構造物以外の工事は含まない。	前月からの変更箇所	

			土木工事 軌道·電気工事			建築·機械工事			監査検査·訓練運転等			令和4年7月8日時点 	
No	工区名	二个 一 完了予定	完了予定		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	完了予定※2		完了予定	÷ 	開始予定※3	⇒開業 完了予定	完了予定	備 考
24	福井下莇生田高架橋	(R4.6) R3.1末	(R4.7) R3.1末	開始時期※1 R2.12初	(R4.6)	(R4.7)	開始時期	(R4.6)	(R4.7)	時期	(R4.6)	(R4.7)	
					R4.12中	R4.12中							
35	福井橋りょう他 	R3.6末	R3.6末	R3.5下			_	_					
36	第2福井トンネル(北)他 	R2.12中	R2.12中	R2.6中			_	_	_				
37	第2福井トンネル(南)他	R3.7末	R3.7末	R2.6初			_	_	_				
38	鯖江橋立高架橋	R3.4末	R3.4末	R3.1中			_	_	_				
39	第2鯖江トンネル他	R2.12末	R2.12末	R2.7初			_	_	_				
40	浅水川橋りょう他	R2.12末	R2.12末	R3.3下			_	_	-				
41	越前三ツ屋高架橋	R3.5末	R3.5末	R3.1初			_	_					
42	武生橋りょう他	R3.5末	R3.5末	R3.4初			_	_	_				
43	<b>南越駅高架橋他</b>	R3.2末	R3.2末	R2.12初		R4.12末	R2.10末	R5.4末	R5.4末		R6.3末	R6.3末	
44	越前平林高架橋他	R3.1末	R3.1末	R3.3初			_	_	_				
45	武生トンネル他	R3.2末	R3.2末	R3.2初			_	_	_				
46	越前中平吹高架橋	R3.2上	R3.2上	R3.2初			_	_	_	R5.5初			
47	日野川橋りょう	R2.12末	R2.12末	R3.2初	R4.12末		_	_	_	-			
48	南越前南条高架橋他	R3.2上	R3.2上	R3.2初			_	_	_				
49	脇本トンネル他	R2.12末	R2.12末	R3.1中			ı	_	_				
50	新北陸トンネル(清水)他	R2.8末	R2.8末	R2.7初			1	_	_				
51	新北陸トンネル(奥野々)	R2.3末	R2.3末	R2.6初			_	_	_				
52	新北陸トンネル(大桐)	R2.12中	R2.12中	R2.6下		R4.12中	1	_	_				
53	新北陸トンネル(葉原)	R3.1末	R3.1末	R2.6中	R4.12中		_	_	_				
54	新北陸トンネル(田尻)	R3.1末	R3.1末	R2.11下			_	_	_				
55	新北陸トンネル(樫曲)他	R2.10末	R2.10末	R2.11初		R5.4末	_	_	_				
56	深山トンネル他	R3.9末	R3.9末	R3.9下			_	_	_				
57	駅部 <b>敦賀駅高架橋</b> 駅終点部	R3.9末 R4.4末	R3.9末 R4.4末	R3.10初 R4.4初	R5.4末		R3.10初 —	R5.4末 —	R5.4末 —				R4.4は土木と軌道・電気を同時施工
58	敦賀車両基地路盤他	R4.3末	R4.3末	R2.4初			R2.12初	R5.4末	R5.4末				R4.4末に軌道引渡し済み

土木工事から軌道工事へ引渡した工区

58工区


[福井駅高架橋工区及び南福井駅高架橋工区は除く]

- ※1:土木工事が一部区間を先行して引渡しを行っている。
- ※2:完了予定及び完了見込は、電車線の監査・検査に関する工事が完了した時期
- ※3:電車線の監査・検査からの期間であり、全線を通して実施する予定。

# 軌道工事の進捗状況



令和4年7月

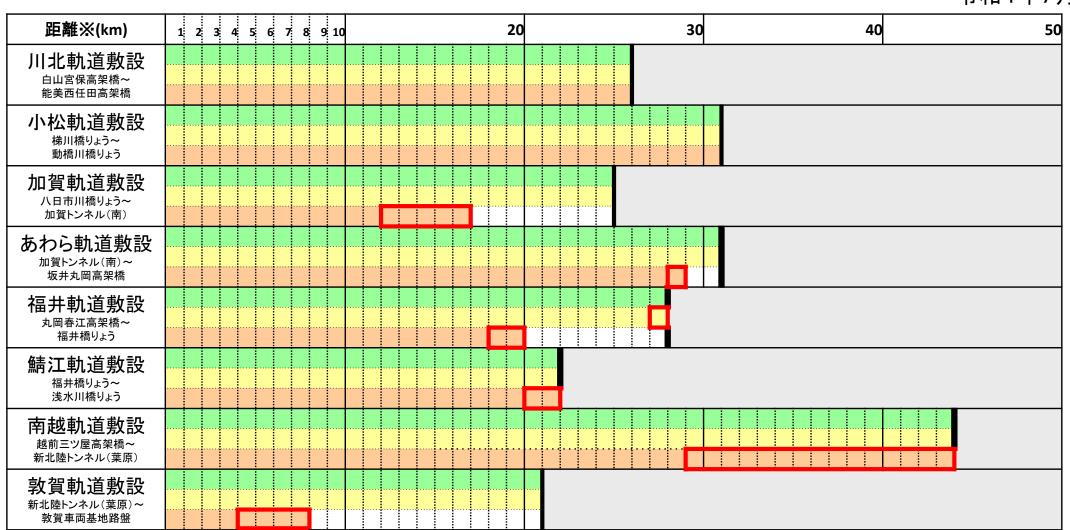

:仮軌道の敷設 ⇒ : 軌道スラブの敷設 ⇒ :レールを敷設・所定の精度で設置 【凡例】(施工順序)


□:前月より進捗した箇所を示す。

※:距離は、レール敷設の予定延長とし、上り線下り線を別々で計上している。(延長1km単位で実績を反映している。)

## 電気工事の進捗状況(電車線)



令和4年7月

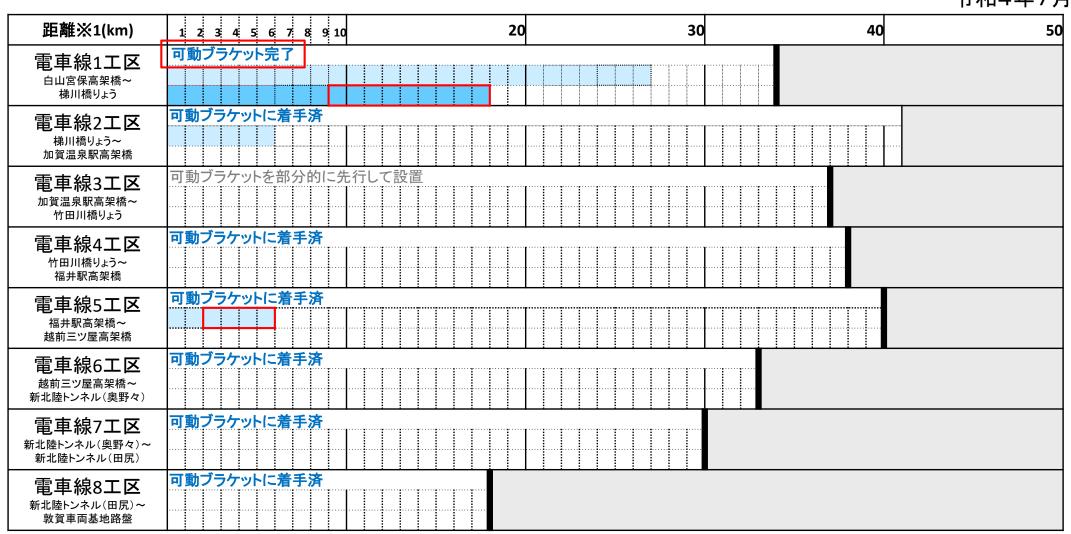



【凡例】(施工順序) 可動ブラケット(※2)の設置 ⇒ :電車線の設置 ⇒ :電車線の設置位置の調整

□:前月より進捗した箇所を示す。

※1: 距離は、電車線設置の予定延長とし、上り線下り線を別々で計上している。(延長1km単位で実績を反映している。)

※2: 電車線を支えるための金物。

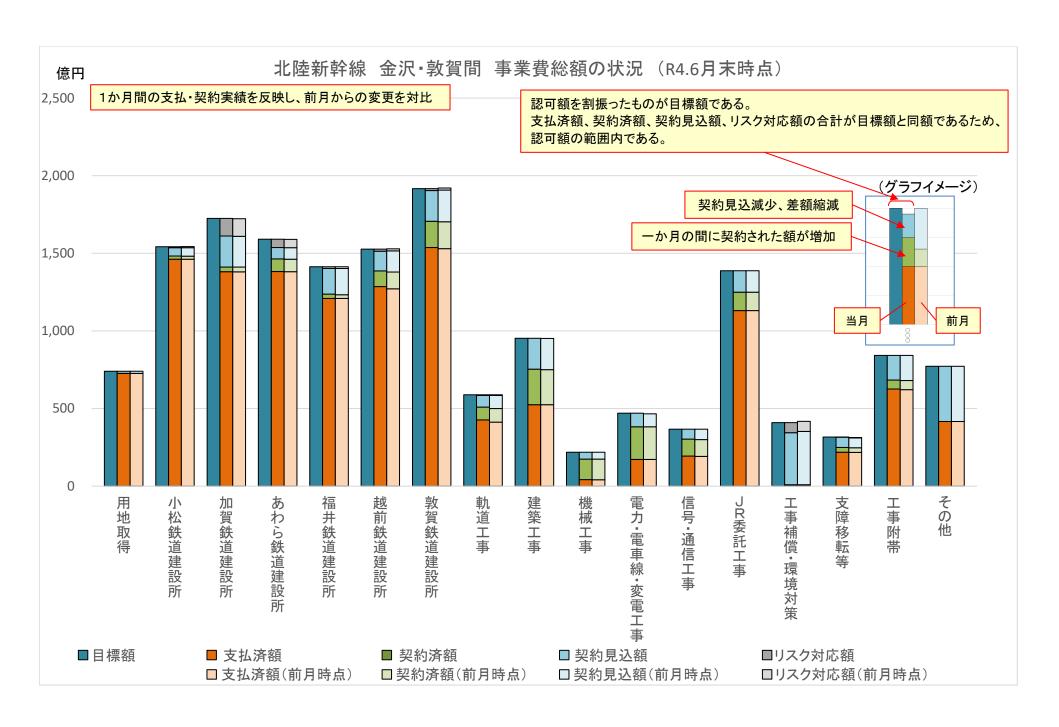

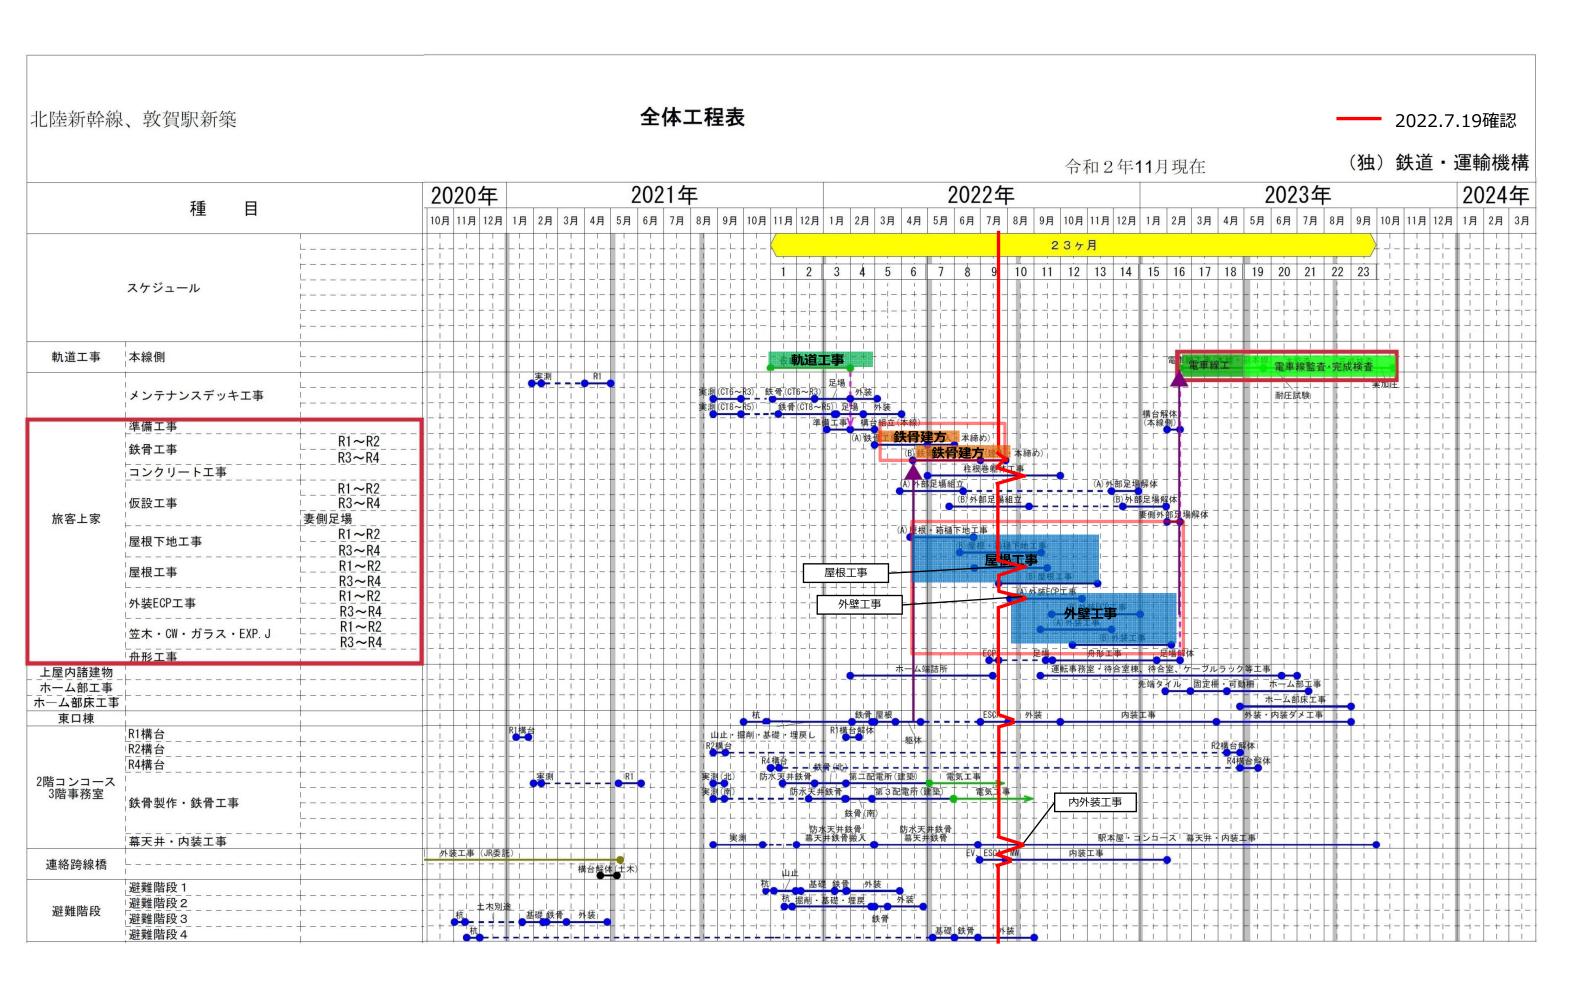

#### リスク管理表

	リスク	発現しているリスク	対応状況				
	気象変化、自然災害、 他地域における自然災 害への対応	_	_				
	予期せぬ地質条件変化への対応	加賀トンネルの対策工実施箇所の経過観察	<ul> <li>・加賀トンネル盤ぶくれ対策について、トンネル全線で経過観察を実施している。</li> <li>・11 月に計測を整理した結果、現時点では追加の対策は不要であり、軌道工事に着手しても問題ないと判断した。</li> <li>・10 月 29 日の計測時に、2 箇所で 1 mm未満の新規クラックが確認された。当該箇所は、水準測量等の計測結果から現時点で明確な隆起が見られていないため、軌道工事を継続することに影響はない。</li> </ul>				
			・7月4日時点の計測結果、明確な隆起傾向はなく盤ぶくれ現象は確認されていない。 ・引き続き経過観察を行う。				
	物価上昇への対応	_	_				
	作業員・資機材不足への対応	半導体や電子部品等の調達困難	・可動式ホーム柵、保守基地天井クレーン、照明器具、温水洗浄便座等の納入時期に 遅延が生じている。今のところ全体工程に影響を与えるほどの遅延は生じない見込 みであり、引き続き調達状況を注視していく。(1/19)				
事			・1 月以降納入時期に更なる遅れはない。引き続き調達状況を注視していく。(2/15) (3/7)(4/11)(5/16)(6/8)(7/8)				
		ウクライナ事案に伴う定期航空便の運休等による影響	・散水消雪用の配管材(高密度ポリエチレン管)の一部はヨーロッパで製造され日本へ空輸しているが、ウクライナ事案に伴う定期航空便の運休等の影響により、一部の資機材で納入時期に遅延が生じている。今のところ全体工程に影響を与えるほどの遅延は生じない見込みであり、引き続き調達状況を注視していく。(4/11)(5/16)・全体工程に影響を与えるほどの遅延は生じておらず、引き続き調達状況を注視していく。(6/8)				
			・7月以降納入時期に更なる遅れはない。引き続き調達状況を注視していく。 (7/8)				
	新型コロナへの対応	R4. 4. 12 (火) ~R4. 5. 18 (水): 9 件の感染を確認	・工事は他の作業員を確保し実施しているため、全体工程への影響無し。				
		R4.5.19 (木) ~R4.6.21 (火):8件の感染を確認	・工事は他の作業員を確保し実施しているため、全体工程への影響無し。				
		R4.6.29 (水):機構 (石川県) 建設所職員1名が新型コロナウイルスに感染	・濃厚接触者なし。 ・他の職員で対応しているため影響無し。				
		R4.6.29 (水): 電気工事(福井県) 受注者の元請職員1名が新型コロナウイルスに感染	・濃厚接触者なし。 ・工事は他の作業員で継続して実施しているため、全体工程への影響無し。				
		R4.7.1 (金):機構(福井県) 機構職員1名が新型コロナウイルスに感染	・濃厚接触者なし。 ・他の職員で対応しているため影響無し。				

現在も継続して対応しているリスク及び令和4年4月以降に発現したリスクを記載

: 前回までの報告内容

#### リスク管理表

		7八ノ日往秋				
		R4.7.1 (金): 電気工事(福井県) 受注者の協力会社職員1名が新型コロナウイルスに感染	・濃厚接触者なし。 ・工事は他の作業員で継続して実施しているため、全体工程への影響無し。			
	新型コロナへの対応	R4.7.4 (月): 建築工事(福井県) 受注者の協力会社職員3名が新型コロナウイルスに感染	・濃厚接触者なし。 ・感染者が従事していた作業を2日間中止したが、その他は他の作業員で継続して実施しているため、全体工程への影響無し。			
		R4.7.6 (水): 建築工事(福井県) 受注者の元請職員1名が新型コロナウイルスに感染	・濃厚接触者なし。 ・工事は他の作業員で継続して実施しているため、全体工程への影響無し。			
		R4.7.7 (木): 電気工事 (石川県)   受注者の元請職員1名が新型コロナウイルスに感染	・濃厚接触者なし。 ・工事は他の作業員で継続して実施しているため、全体工程への影響無し。			
		R4.7.12 (火): 電気工事(福井県) 受注者の協力会社職員1名が新型コロナウイルスに感染	・濃厚接触者 1 名。7/19 (火) までホテルにて療養。 ・工事は他の作業員で継続して実施しているため、全体工程への影響無し。			
		R4.7.14(木): 電気工事(福井県)	・濃厚接触者なし。			
		受注者の元請職員 1 名が新型コロナウイルスに感染 R4. 7. 16(土): 土木工事(石川県)	・工事は他の作業員で継続して実施しているため、全体工程への影響無し。 ・濃厚接触者なし。			
工事		受注者の元請職員 1 名が新型コロナウイルスに感染 R4. 7. 19 (火): 土木工事(福井県)	・工事は着手前のため、全体工程への影響無し。 ・濃厚接触者なし。			
		受注者の元請職員 1 名が新型コロナウイルスに感染	・工事は他の作業員で継続して実施しているため、全体工程への影響無し。			
		R4.7.19(火): 電気工事(福井県) 受注者の協力会社職員1名が新型コロナウイルスに感染	・濃厚接触者なし。 ・工事は他の作業員で継続して実施しているため、全体工程への影響無し。			
	法令変更への対応	_	_			
	関係機関への対応	_	_			
	施工計画変更への対応	_	_			
	労働災害に関する対応	_	_			
	公衆災害に関する対応	_	_			
	トラブルに関する対応	_	_			
	その他リスク要因とな り得る懸念事項	_	_			
