

議事1 鉄道助成業務の実施状況に関する事項（審議事項）

幹線鉄道等活性化事業費補助

南阿蘇鉄道株式会社

JR豊肥線乗り入れ設備整備事業



幹線鉄道等活性化事業費補助

① 高速化工事

在来の幹線鉄道の高速化のための鉄道施設の整備を行う事業

② まちづくり連携高速化工事

まちづくりと連携した在来の幹線鉄道の高速化のための鉄道施設の整備を行う事業

③ 旅客線化工事

大都市及びその周辺における貨物鉄道の旅客線化のための鉄道施設の整備を行う事業

④ 貨物列車走行対応化工事

旅客専用線の貨物列車走行対応化及び貨物列車の輸送力増強のための鉄道施設の整備を行う事業

⑤ 貨物拠点整備事業

貨物駅の拠点化のための鉄道施設の整備を行う事業

⑥ 乗継円滑化工事

乗継円滑化のための鉄道施設の整備を行う事業

⑦ 地域公共交通計画事業

地域公共交通活性化・再生法第5条に基づき作成された又は作成されることが確実と見込まれる地域公共交通計画に位置づけられた利用促進等の取組みを伴って実施される鉄軌道利用者の利便性向上を図るための施設の整備を行う事業

南阿蘇鉄道 JR豊肥線乗り入れ設備整備事業

地域公共交通計画事業

※令和2年度までは「形成計画事業」(法律改正による名称変更)

制度の概要

潜在的な鉄道利用ニーズが大きい地方都市やその近郊の路線等について、地域公共交通活性化・再生法に基づく地域公共交通計画の枠組みを活用した、地域鉄道の利用促進や地域の活性化を図るべく、鉄道の利便性向上のための施設整備に対する支援。

補助対象設備


輸送ニーズに対応した駅・路線の再配置、ダイヤ改正・増便等に必要な施設の整備 等
(例:新駅の整備、行き違い設備の新設、乗り入れ設備の整備 等)

補助率

補助対象経費の1/3以内(地方公共団体から受ける出資金及び補助金、負担金の合計額以内)


補助の仕組

① 鉄軌道事業者・第三セクターが補助事業者の場合



南阿蘇鉄道の場合

② 法定協議会が補助事業者の場合




※ 事業完了後は整備された施設について、法定協議会は規約等であらかじめ定められた者に移管する。

補助事業者の概要 ①



昭和 60 年（1985 年）、旧国鉄高森線から第三セクター「南阿蘇鉄道」（愛称「南鉄」）として設立

| | |
|------|-------------------------------------|
| 商号 | 南阿蘇鉄道株式会社 |
| 所在地 | 〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町大字高森1537-2 |
| 設立 | 昭和60年4月1日 |
| 営業開始 | 昭和61年4月1日 |
| 会社目的 | 旅客鉄道業、旅行業及び広告業、お土産品の販売、前各号に関する一切の事業 |
| 資本金 | 授權資本:1億円 払込資本:1億円 |

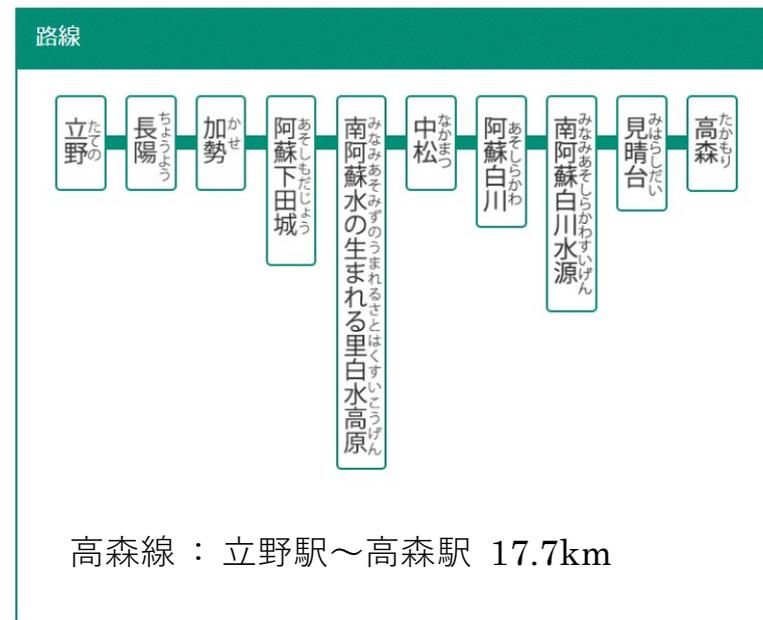

【輸送実績】 4 6 千人／年（2 0 2 1 年度） ※中松～高森間の実績

【主要株主】 南阿蘇村 56.5%、高森町 33.9%、山都町 7.0%、西原村、2.5%、大津町 0.05%

位置図



近況

平成28年(2016年) 4月 熊本地震により被災し、全線で運行を休止

平成28年(2016年) 7月 一部区間(中松～高森間)で運転再開

令和 5年(2023年) 4月 上下分離方式に移行

(運行:南阿蘇鉄道株式会社/施設保有:一般社団法人南阿蘇鉄道管理機構)

令和 5年(2023年) 7月 全線運転再開、JR豊肥線肥後大津駅までの乗り入れ開始



JR豊肥線乗り入れ設備整備事業

1. 事業概要

熊本地震により大きな被害を受けた南阿蘇鉄道の創造的復興を目的に、地域住民の利便性向上や観光客のさらなる誘致を目指すため、JR豊肥線・肥後大津駅(阿蘇くまもと空港最寄り駅)までの直通乗入れを行う。

2. 事業実施箇所

JR九州豊肥線、南阿蘇鉄道高森線 立野駅

3. 事業内容

レール・分岐器撤去新設、踏切設置等

4. 事業期間

2022年度～2023年8月末

5. 事業費及び国費


事業費 279百万円、国費 93百万円(補助率1/3)

6. 供用開始日


2023年7月15日



補助事業の概要 ②

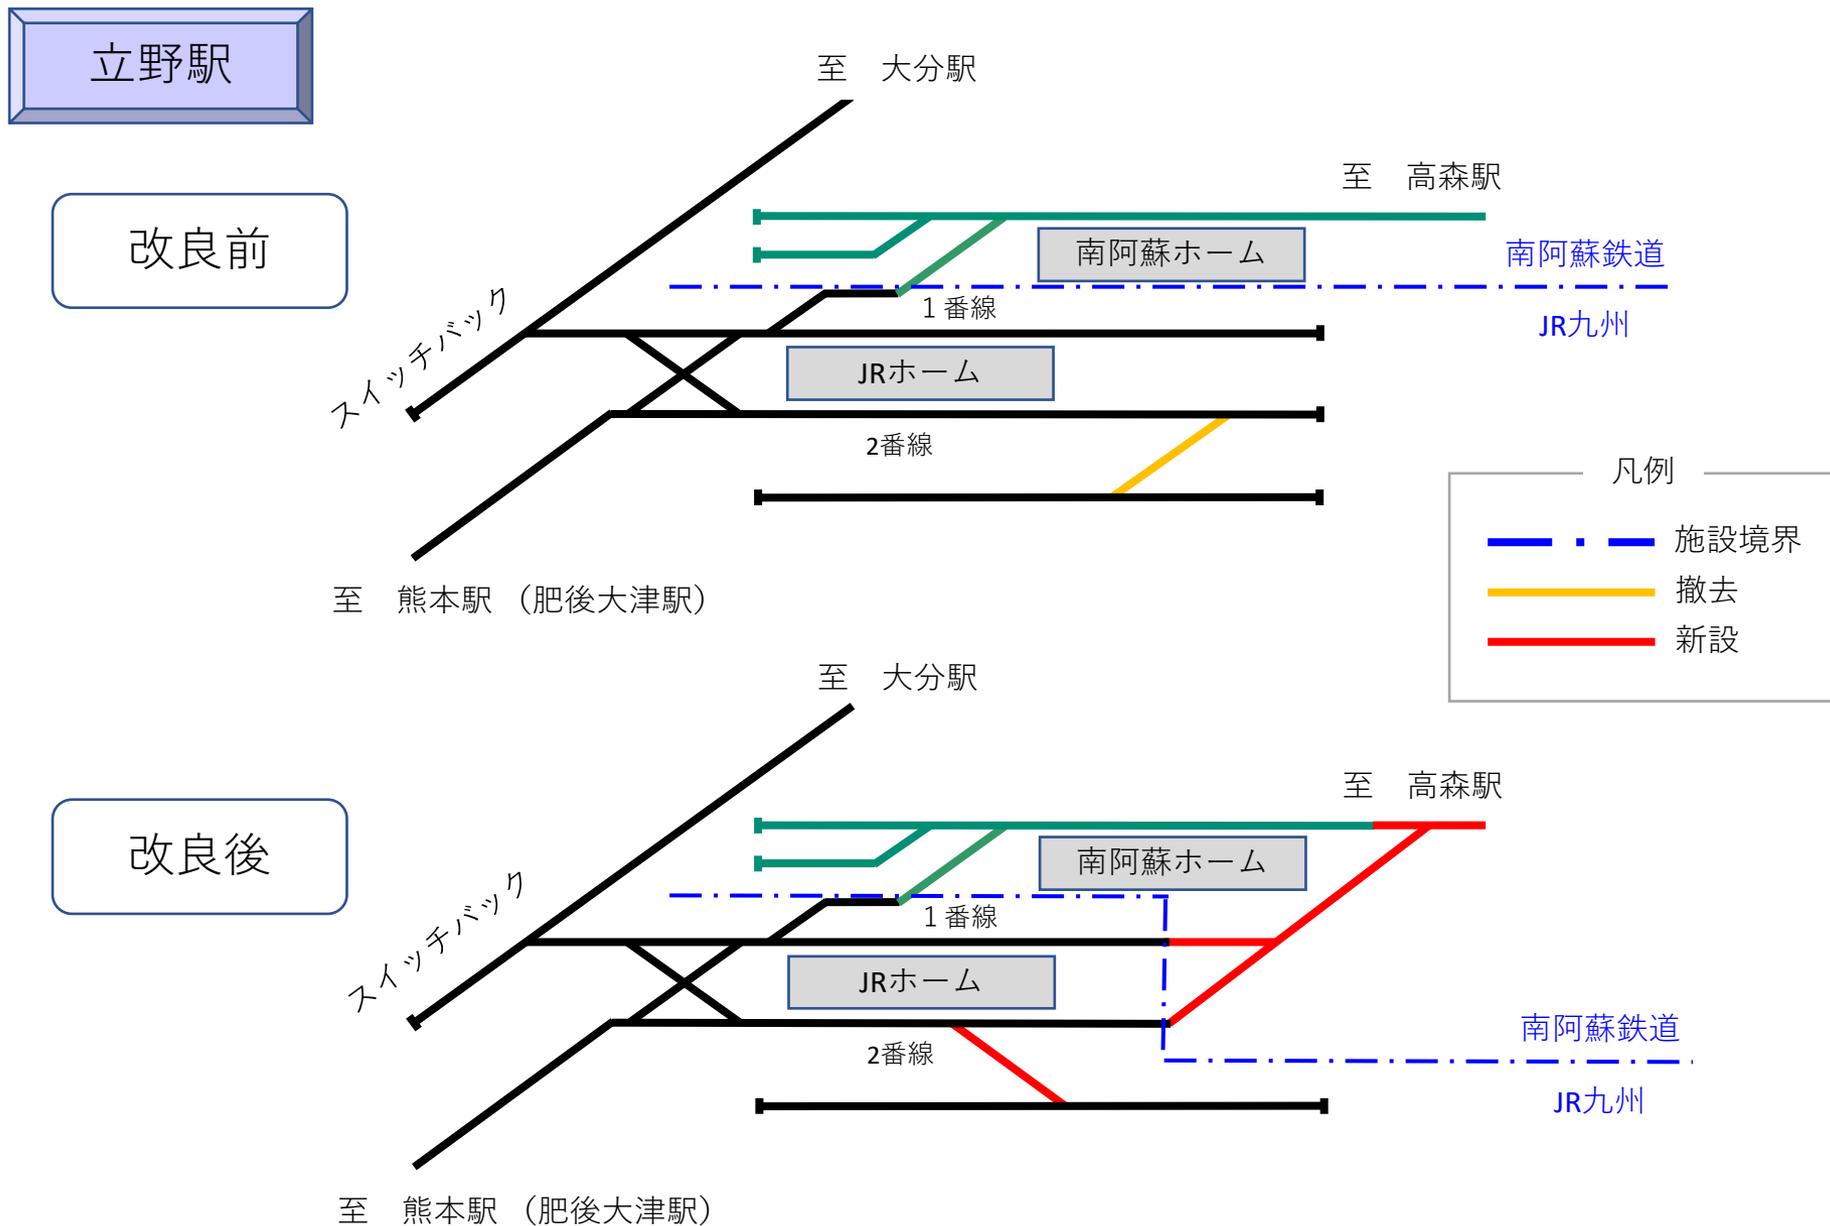

主要な工事内容 ①

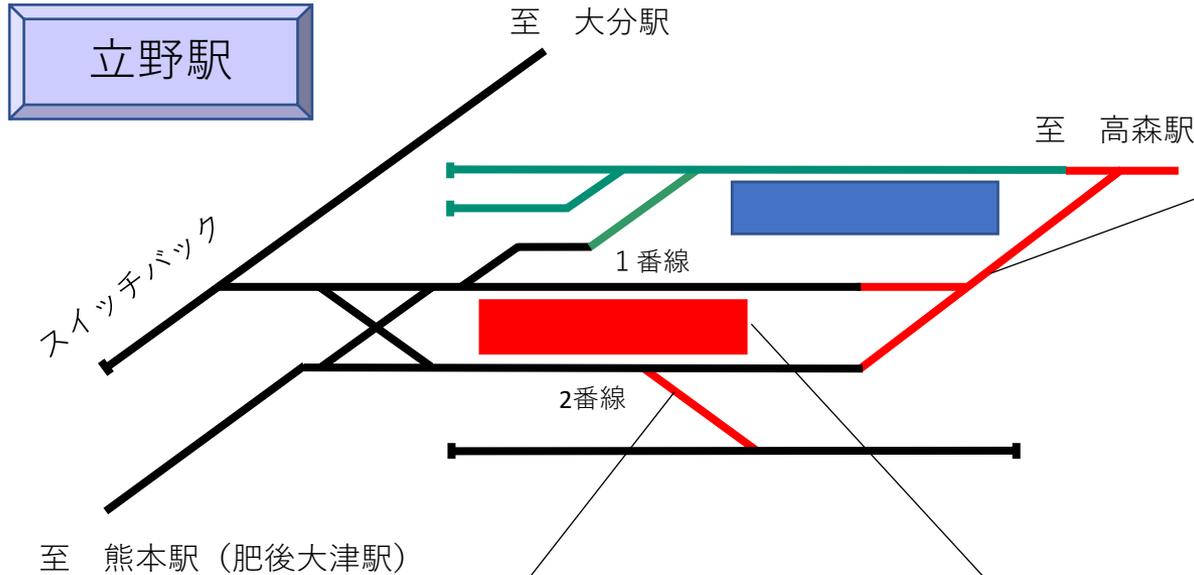

軌道整備 (約200m)
分岐器 (新設)
信号保安設備 (新設) 等

JR線乗入設備の整備



横取装置 (新設)
軌道整備

保守車両の進路用 (機能補償工事)




乗降口案内表示 (新設)

南阿蘇鉄道車両用 (JR車両と停止位置が異なるため) <1番線・2番線>




主要な工事内容 ②

高森駅

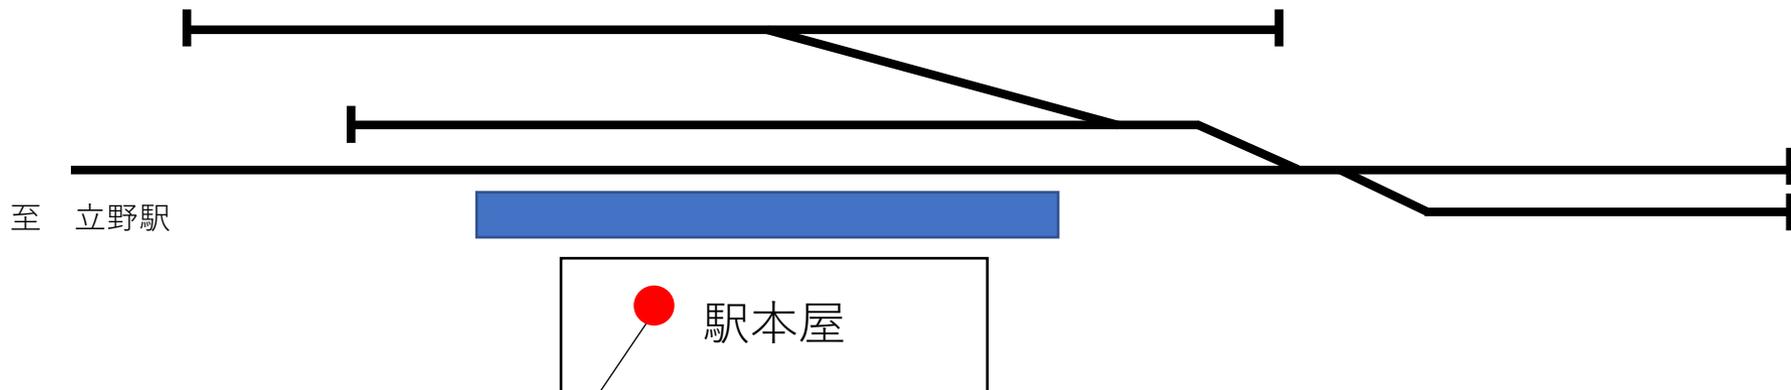


運行管理表示器 (新設)

立野駅の線路配線変更に伴い運行管理表示器を新設
※既存表示器の改修より新設の方が安価

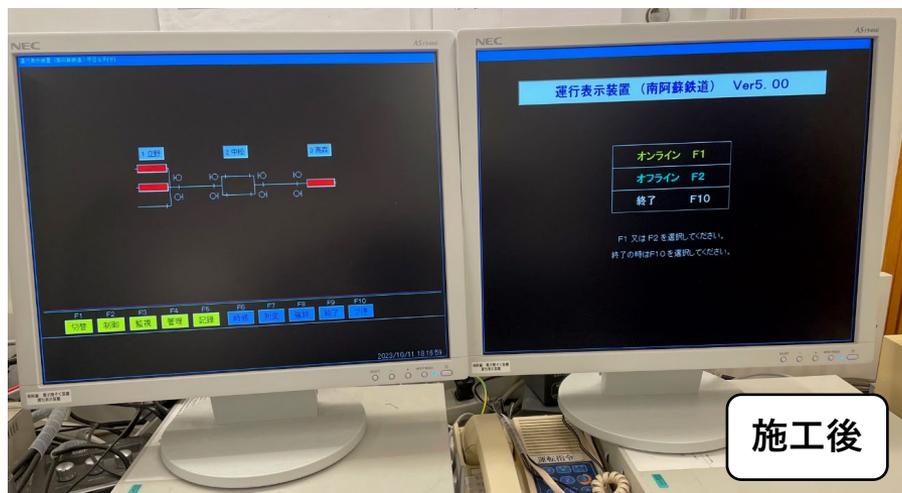

主要な工事内容 ③

肥後大津駅



列車停止位置目標 (新設) 乗降口案内表示 (新設)

列車を定位置に停車させるためのもの。
JR九州の車両と南阿蘇鉄道の車両の編成長が異なるため、南阿蘇鉄道の車両が停止する位置も異なることから設置


乗降口案内表示

列車停止位置目標



補助金交付手続き

令和4年度当初予算

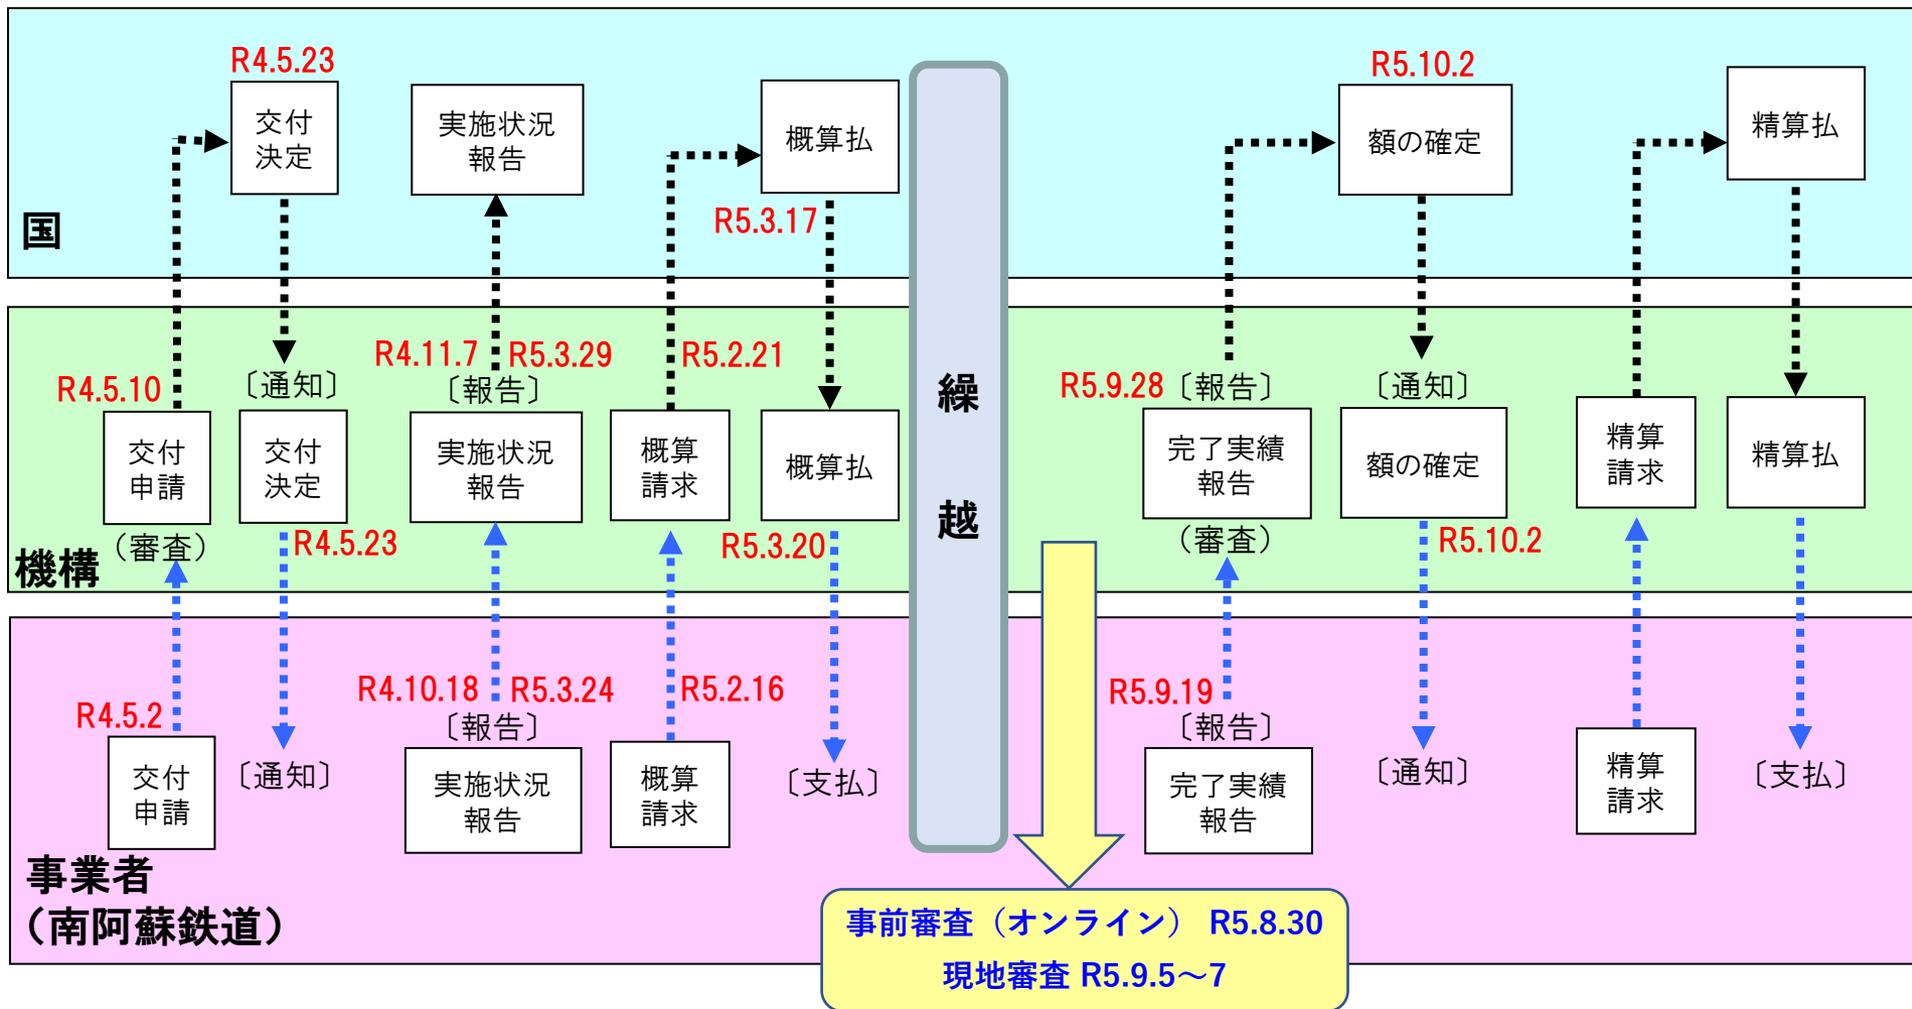

補助事業の実施計画

| 費目 | 施工内容 | 交付決定 | | 実施計画変更 (令和4年度末) | | | 令和3年度迄 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度以降 | |
|-------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|--------|------|----------------|------------|-----------------------|------------|---------|------|
| | | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 当初比 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 |
| 土木費 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 線路設備費 | | 161,700,000 | | 161,700,000 | 0 | | | | 0 | | 101,967,805 | | | |
| | レール・分岐器撤去新設、踏切設置 | (78,900,000) | | (78,900,000) | (0) | | | | (0) | | (49,760,289) | | | |
| | 直接乗入れのための自動列車停止装置改良費用 | (62,000,000) | | (62,000,000) | (0) | | | | (0) | | (39,053,669) | | | |
| | 測量試験費等 | (20,800,000) | | (20,800,000) | (0) | | | | (0) | | (13,153,847) | | | |
| 開業設備費 | | 190,000,000 | | 190,000,000 | 0 | | | | 121,210,000 | | 56,259,435 | | | |
| | <南阿蘇鉄道工事> | | | | | | | | | | | | | |
| | 南鉄立野駅構内改良・構内連動機取替、南鉄運行表示装置改修など | (83,000,000) | | (93,819,000) | (10,819,000) | | | | (90,110,000) | | (3,709,000) | | | |
| | その他付帯工 | (16,200,000) | | (18,325,000) | (2,125,000) | | | | (16,200,000) | | (2,125,000) | | | |
| | 測量試験費等 | (14,900,000) | | (16,905,000) | (2,005,000) | | | | (14,900,000) | | (2,005,000) | | | |
| | <JR九州委託工事> | | | | | | | | | | | | | |
| | JR立野駅構内連動機改修、JR博多総合指令システム改修など | (60,000,000) | | (45,051,000) | (-14,949,000) | | | | (0) | | (38,252,144) | | | |
| | 乗車位置案内、その他付帯工 | (6,000,000) | | (6,000,000) | (0) | | | | (0) | | (3,873,635) | | | |
| | 測量試験費等 | (9,900,000) | | (9,900,000) | (0) | | | | (0) | | (6,294,656) | | | |
| 用地費 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 合計 | | 351,700,000 | 117,233,000 | 351,700,000 | 0 | 117,233,000 | | | 121,210,000 | 40,403,000 | 158,227,240 | 52,742,746 | | |
| 備考 | | | | 軽微な変更(手続き不要) | | | | | | | 令和4年度事業の繰越事業完了:令和5年8月 | | | |

補助事業の実施状況


| 費目 | 施工内容 | 計画額 (変更後) | | 令和4年度 | | | | | | | | 進捗率 | | |
|-------|---|----------------|-------------|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | | | 1/四半期 | | 2/四半期 | | 3/四半期 | | 4/四半期 | | | 小計 | |
| | | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | | 事業費 | 補助金額 |
| 土木費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | — |
| 線路設備費 | | 161,700,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0% |
| | レール・分岐器撤去新設、踏切設置 | (78,900,000) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0%) |
| | 直接乗入れのための自動列車停止装置改良費用 | (62,000,000) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0%) |
| | 測量試験費等 | (20,800,000) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0%) |
| 開業設備費 | | 190,000,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 121,210,000 | | 121,210,000 | | 64% |
| | <南阿蘇鉄道工事> 南鉄立野駅構内改良・構内運動機取替、 南鉄運行表示装置改修など | (93,819,000) | | (0) | | (0) | | (0) | | (90,110,000) | | (90,110,000) | | (96%) |
| | その他付帯工 | (18,325,000) | | (0) | | (0) | | (0) | | (16,200,000) | | (16,200,000) | | (88%) |
| | 測量試験費等 | (16,905,000) | | (0) | | (0) | | (0) | | (14,900,000) | | (14,900,000) | | (88%) |
| | <JR九州委託工事> JR立野駅構内運動機改修、JR博多総合 指令システム改修など | (45,051,000) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0%) |
| | 乗車位置案内、その他付帯工 | (6,000,000) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0%) |
| | 測量試験費等 | (9,900,000) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) | | (0%) |
| 用地費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | — |
| 合計 | | 351,700,000 | 117,233,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,210,000 | 40,403,000 | 121,210,000 | 40,403,000 | 34% |

| 費目 | 施工内容 | 令和5年度 | | | | | | | | 令和4年度・令和5年度 合計 | | 不用 | | |
|-------|---|-------|------|----------------|------------|-------|------|-------|------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | 1/四半期 | | 2/四半期 | | 3/四半期 | | 4/四半期 | | 小計 | | 事業費 | 補助金額 | |
| | | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | | | |
| 土木費 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 線路設備費 | | 0 | | 101,967,805 | | | | | | 101,967,805 | | 101,967,805 | | 59,732,195 |
| | レール・分岐器撤去新設、踏切設置 | (0) | | (49,760,289) | | | | | | (49,760,289) | | (49,760,289) | | (29,139,711) |
| | 直接乗入れのための自動列車停止装置改良費用 | (0) | | (39,053,669) | | | | | | (39,053,669) | | (39,053,669) | | (22,946,331) |
| | 測量試験費等 | (0) | | (13,153,847) | | | | | | (13,153,847) | | (13,153,847) | | (7,646,153) |
| 開業設備費 | | 0 | | 56,259,435 | | | | | | 56,259,435 | | 177,469,435 | | 12,530,565 |
| | <南阿蘇鉄道工事> 南鉄立野駅構内改良・構内運動機取替、 南鉄運行表示装置改修など | (0) | | (3,709,000) | | | | | | (3,709,000) | | (93,819,000) | | (0) |
| | その他付帯工 | (0) | | (2,125,000) | | | | | | (2,125,000) | | (18,325,000) | | (0) |
| | 測量試験費等 | (0) | | (2,005,000) | | | | | | (2,005,000) | | (16,905,000) | | (0) |
| | <JR九州委託工事> JR立野駅構内運動機改修、JR博多総合 指令システム改修など | (0) | | (38,252,144) | | | | | | (38,252,144) | | (38,252,144) | | (6,798,856) |
| | 乗車位置案内、その他付帯工 | (0) | | (3,873,635) | | | | | | (3,873,635) | | (3,873,635) | | (2,126,365) |
| | 測量試験費等 | (0) | | (6,294,656) | | | | | | (6,294,656) | | (6,294,656) | | (3,605,344) |
| 用地費 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 合計 | | 0 | 0 | 158,227,240 | 52,742,746 | | | | | 158,227,240 | 52,742,746 | 279,437,240 | 93,145,746 | 72,262,760 |

事前審査(オンライン)

【令和5年8月30日】

13:00-14:00 事業概要説明



書類・現地審査

書類審査

【令和5年9月5日】 10:30-17:00

【令和5年9月6日】 10:00-17:00

現地審査

【令和5年9月7日】 10:00-12:00

@立野駅

事前審査をオンラインにて実施することにより、

- ・ 現地審査時の事業概要説明を省略し、現地での書類審査時間を確保
- ・ 事前に審査員が事業概要を把握することにより、現地審査の効率化を図る

□ 現地審査(書類審査)



書類審査の様子
(全19件の契約等を2班に分けて確認)

審査のポイント

- 事業内容(契約、工事等)が補助目的に沿ったものであるか
- 補助事業の遂行上、必要なものであるか
- 補助事業としての手続きの正確性、合規性
- 補助事業内容の経済性、効率性、有効性

□ 書類審査(審査チェック対象項目(事項:工事))

- ① 工事内容の確認
- ② 契約方法
- ③ 契約内容
- ④ 工事施工に関する確認
- ⑤ 工事完了に関する確認
- ⑥ 発生品の処理に関する確認
- ⑦ 委託工事の確認
- ⑧ 直営工事に関する確認
- ⑨ 支払に関する確認

補助金審査の実施状況 ④

□ 書類調書(様式)

令和4年度(繰越)事業 幹線鉄道等活性化事業 補助対象経費明細書

(単位:円)

| 審査番号 | 契約内容 | | | | | | | 支払状況 | | | 補助対象経費 | 備考 | | |
|------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------|---------------|------|-----------------------|----|-----------------------|----|
| | 契約件名 (契約の相手方) | 予定価格 契約方式 | 積算方式 支給品有無 | 契約年月日 (変更後) | 完了予定 年月日 (変更後) | 契約金額 下段:(消費税込額) | うち補助対象外 下段:(消費税込額) | 検収年月日 | 支払年月日 (見込) | 支払区分 | 支払(見込)額 下段:(消費税込額) | | うち補助対象外 下段:(消費税込額) | 費目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 審査番号 | 契約内容 | | | | | | | 補助対象経費 | 備考 |
|------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|----|
| | ① 契約件名 (契約の相手方) | ② 予定価格 ② 契約方式 | ② 積算方式 支給品有無 | ③ 契約年月日 (変更後) | ④ ⑤ 完了予定 年月日 (変更後) | ③ 契約金額 下段:(消費税込額) | うち補助対象外 下段:(消費税込額) | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | 開業設備費 | 0 |
| | | | | | | | | 用地費 | 0 |
| | | | | | | | | 合計 | 0 |

| 支払状況 ⑨ | | | | 補助対象経費 | 備考 ⑥ |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------|--------|------|
| 支払年月日 (見込) | 支払区分 | 支払(見込)額 下段:(消費税込額) | うち補助対象外 下段:(消費税込額) | 費目 | |
| | | | | | |

□ 現地審査(現場調査)



現場調査の様子
(現場での状況確認)

審査のポイント

- 設計図書、仕様書通り施工されているか。
- 施工状況は適切か。
- 補助事業の遂行上、必要なものであるか。
- 補助対象外の工事が含まれていないか。

補助金審査の実施状況 ⑥

□ 審査チェックシート

| JRTT Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency | | 補助事業者の名称 | | 令和4年度 | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| *補助金の額の確定に係る審査チェックシート* | | 南阿蘇鉄道株式会社 | | | |
| 補助金の名称 | 幹線鉄道等活性化事業費補助 | 補助事業者の名称 | 南阿蘇鉄道株式会社 | | |
| 交付決定額(補助対象経費) | 円 | ①契約内容 | ・随意契約の理由が妥当である | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 実績報告額(実績額) | 円 | ・適正な契約書等が整えられている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 確定補助金額 | 円 | ・適正な金額の基となる積算方法が適切である | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 事項 地方公共団体の協賛補助 | 該当の有無 有 無 <input type="checkbox"/> | ・協賛等の内容の変更に伴う契約変更手続が執られている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ・地方公共団体の協賛補助が確保されている | <input checked="" type="checkbox"/> | ④納入(設置)の完了に関する確認 | ・履行確認が適正に行われている | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| (協賛補助確保額) | 円 | ・設備等の納入(設置)が適正に履行されている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 事項 工事 | 該当の有無 有 無 <input type="checkbox"/> | ⑤支払に関する確認 | ・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| (1)書類等の審査 | | (2)現場調査 | ・仕様書等のとおりに納入(設置)されている | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ①工事内容の確認 | ・工事内容が補助事業に適合している | 事項 用地の取得等 | 該当の有無 有 無 <input type="checkbox"/> | | |
| ②契約方法 | ・契約手続が適正に行われている | (1)書類等の審査 | | | |
| ・随意契約の理由が妥当である | <input checked="" type="checkbox"/> | ①取得内容の確認 | ・土地等の取得又は使用の内容が補助事業に適合している | <input type="checkbox"/> | |
| ③契約内容 | ・適正な契約書等が整えられている | ②取得価格の確認 | ・適正な方法により取得価格が決定されている | <input type="checkbox"/> | |
| ・契約金額の基となる積算方法が適切である | <input checked="" type="checkbox"/> | ③契約内容 | ・適正な契約書等が整えられている | <input type="checkbox"/> | |
| ・(ア)の(イ)の仕様を経済的なものとしている | <input checked="" type="checkbox"/> | ④引渡し等の確認 | ・土地の引渡しが適正に行われている | <input type="checkbox"/> | |
| ・工事内容の変更に伴う契約変更手続が執られている | <input checked="" type="checkbox"/> | ⑤支払に関する確認 | ・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている | <input type="checkbox"/> | |
| ④工事施工に関する確認 | ・施工管理が適正に行われている | (2)現場調査 | ・補助事業の用に供することが可能となっている | <input type="checkbox"/> | |
| ・支給品の管理が適正に行われている | <input checked="" type="checkbox"/> | 事項 建物移転等の補償 | 該当の有無 有 無 <input type="checkbox"/> | | |
| ⑤工事完了に関する確認 | ・しゅん功確認が適正に行われている | (1)書類等の審査 | | | |
| ・発生品の処理が適正に行われている | <input checked="" type="checkbox"/> | ①補償内容の確認 | ・補償が補助事業に起因している | <input type="checkbox"/> | |
| ⑥受託工事の確認 | ・受託工事の内容が補助事業に適合している | ②補償金額の確認 | ・適正な方法により補償金額が算定されている | <input type="checkbox"/> | |
| ・適正な協定書等が整えられている | <input checked="" type="checkbox"/> | ③契約内容 | ・適正な契約書等が整えられている | <input type="checkbox"/> | |
| ・受託工事が適正に履行されている | <input checked="" type="checkbox"/> | ④移転等の確認 | ・補償対象建物等の移転が適正に行われている | <input type="checkbox"/> | |
| ⑦受託工事の完了に関する確認 | ・適正な協定書等が整えられている | ⑤支払に関する確認 | ・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている | <input type="checkbox"/> | |
| ・適正な協定書等が整えられている | <input checked="" type="checkbox"/> | (2)現場調査 | ・補償対象となった建物等の撤去が完了している | <input type="checkbox"/> | |
| ⑧直営工事に関する確認 | ・直営工事に係る人件費の算出が適正に行われている | 事項 物品・材料購入等 | 該当の有無 有 無 <input type="checkbox"/> | | |
| ⑨支払に関する確認 | ・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている | (1)書類等の審査 | | | |
| (2)現場調査 | ・設計図書、仕様書等のとおりに完成している | ①物品等の確認 | ・物品等の取得目的、仕様、数量等が補助事業に適合している | <input type="checkbox"/> | |
| 事項 調査・設計・測量 | 該当の有無 有 無 <input type="checkbox"/> | ②契約方法 | ・契約手続が適正に行われている | <input type="checkbox"/> | |
| (1)書類等の審査 | | ③契約内容 | ・適正な契約書等が整えられている | <input type="checkbox"/> | |
| ①調査内容の確認 | ・調査等の内容が補助事業に適合している | ④移転等の確認 | ・協賛等の理由が妥当である | <input type="checkbox"/> | |
| ②契約方法 | ・契約手続が適正に行われている | ⑤支払に関する確認 | ・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている | <input type="checkbox"/> | |
| ・随意契約の理由が妥当である | <input type="checkbox"/> | (2)現場調査 | ・仕様、数量等が適正である | <input type="checkbox"/> | |
| ③契約内容 | ・適正な契約書等が整えられている | 事項 校正指示事項の有無 | 有 無 <input type="checkbox"/> | | |
| ・契約金額の基となる積算方法が適切である | <input type="checkbox"/> | 「誤 要」 | | | |
| ・協賛等の内容の変更に伴う契約変更手続が執られている | <input type="checkbox"/> | | | | |
| ④調査等の完了に関する確認 | ・履行確認が適正に行われている | | | | |
| ・調査等が適正に履行されている | <input type="checkbox"/> | | | | |
| ⑤受託調査等の確認 | ・受託調査等の内容が補助事業に適合している | | | | |
| ・適正な協定書等が整えられている | <input type="checkbox"/> | | | | |
| ⑥直営調査等に関する事項 | ・直営調査等に係る人件費の算出が適正に行われている | | | | |
| ⑦支払に関する確認 | ・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている | | | | |
| ⑧成果物の確認 | ・設計図書、仕様書等のとおりに完了している | | | | |
| (2)現場調査 | ・設計図書、仕様書等のとおりに完了している | | | | |
| 事項 仕様図書・設備 | 該当の有無 有 無 <input type="checkbox"/> | | | | |
| (1)書類等の審査 | | | | | |
| ①設備等の確認 | ・設備等の内容が補助事業に適合している | | | | |
| ②契約方法 | ・契約手続が適正に行われている | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

※ 審査結果の詳細については次ページ参照

補助金審査の実施状況 ⑦

□ 審査チェックシート(チェック項目拡大)

| 事項 | 工事 | 該当の有無 | 有 | 無 |
|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------------|---|
| (1)書類等の審査 | | | | |
| ①工事内容の確認 | | | | |
| | ・工事内容が補助事業に適合している | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ②契約方法 | | | | |
| | ・契約手続が適正に行われている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ・随意契約の理由が妥当である | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ③契約内容 | | | | |
| | ・適正な契約書等が整えられている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ・契約金額の基となる積算方法が適切である | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | —(コンクリートの仕様を経済的なものとしている | | <input type="checkbox"/> |) |
| | ・工事内容の変更に伴う契約変更手続が執られている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ④工事施工に関する確認 | | | | |
| | ・施工管理が適正に行われている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ・支給品の管理が適正に行われている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ⑤工事完了に関する確認 | | | | |
| | ・しゅん功確認が適正に行われている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ・工事が適正に完了している | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ⑥発生の処理に関する確認 | | | | |
| | ・発生品の処理が適正に行われている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ⑦委託工事の確認 | | | | |
| | ・委託工事の内容が補助事業に適合している | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ・適正な協定書等が整えられている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ・委託工事が適正に履行されている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ⑧直営工事に関する確認 | | | | |
| | ・直営工事に係る人件費の算出が適正に行われている | | <input type="checkbox"/> | |
| ⑨支払に関する確認 | | | | |
| | ・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| (2)現場調査 | | | | |
| | ・設計図書、仕様書等のとおり完成している | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| 事項 | 機械器具・設備 | 該当の有無 | 有 | 無 |
|------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------|---|
| (1)書類等の審査 | | | | |
| ①設備等の確認 | | | | |
| | ・設備等の内容が補助事業に適合している | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ②契約方法 | | | | |
| | ・契約手続が適正に行われている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ・随意契約の理由が妥当である | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ③契約内容 | | | | |
| | ・適正な契約書等が整えられている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ・契約金額の基となる積算方法が適切である | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ・設備等の内容の変更に伴う契約変更手続が執られている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ④納入(設置)の完了に関する確認 | | | | |
| | ・履行確認が適正に行われている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ・設備等の納入(設置)が適正に履行されている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ⑤支払に関する確認 | | | | |
| | ・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| (2)現場調査 | | | | |
| | ・仕様書等のとおり納入(設置)されている | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

※ その他事項

- ・ 調査・設計・測量
- ・ 用地の取得等
- ・ 建物移転等の補償
- ・ 物品・材料購入等

については、該当なし

補助金審査の結果

補助事業の成果が補助金の交付の目的に適合していた。
補助事業の内容について一部査定に値する事実があった。



当該補助事業で不要な備品にかかる費用を査定



令和5年10月 2日 補助金の額の確定

令和5年11月20日 補助金の交付（支払い）

| | | |
|--------|---|--------------|
| 補助対象経費 | : | 279,437,240円 |
| 補助金交付額 | : | 93,145,746円 |
