



令和5年12月時点

1. 監査・検査等

- ・総合監査・検査が12月8日に完了し、12月10日にJR西日本に管理引継ぎをした。
 - ・国土交通省による完成検査を12月20日から12月28日に実施予定。
- その後、JR西日本による訓練運転を実施予定。

2. 事業費

- ・事業費総額は、認可の範囲内である。

総合監査・検査終了、JR西日本へ管理を引継ぎました！

実車を使用して試験を行う総合監査・検査を9月22日から開始しておりましたが、安全走行に問題がないことが確認されたため、12月8日に車両走行試験の全工程が完了し、総合監査・検査が終了しました。

本試験を実施している間は、鉄道・運輸機構が建設した施設を管理してきましたが、12月10日をもって今後の開業に向けた準備を行うJR西日本へ管理を引継ぎました。

引継ぎを受け、来年3月16日の開業に向けて、国土交通省による完成検査及びJR西日本による訓練運転が実施される予定です。




管理引継ぎの様子



立入り禁止標の管理者の変更の様子

北陸新幹線(金沢・敦賀間)完成・開業までのスケジュール

完成・開業までのスケジュール

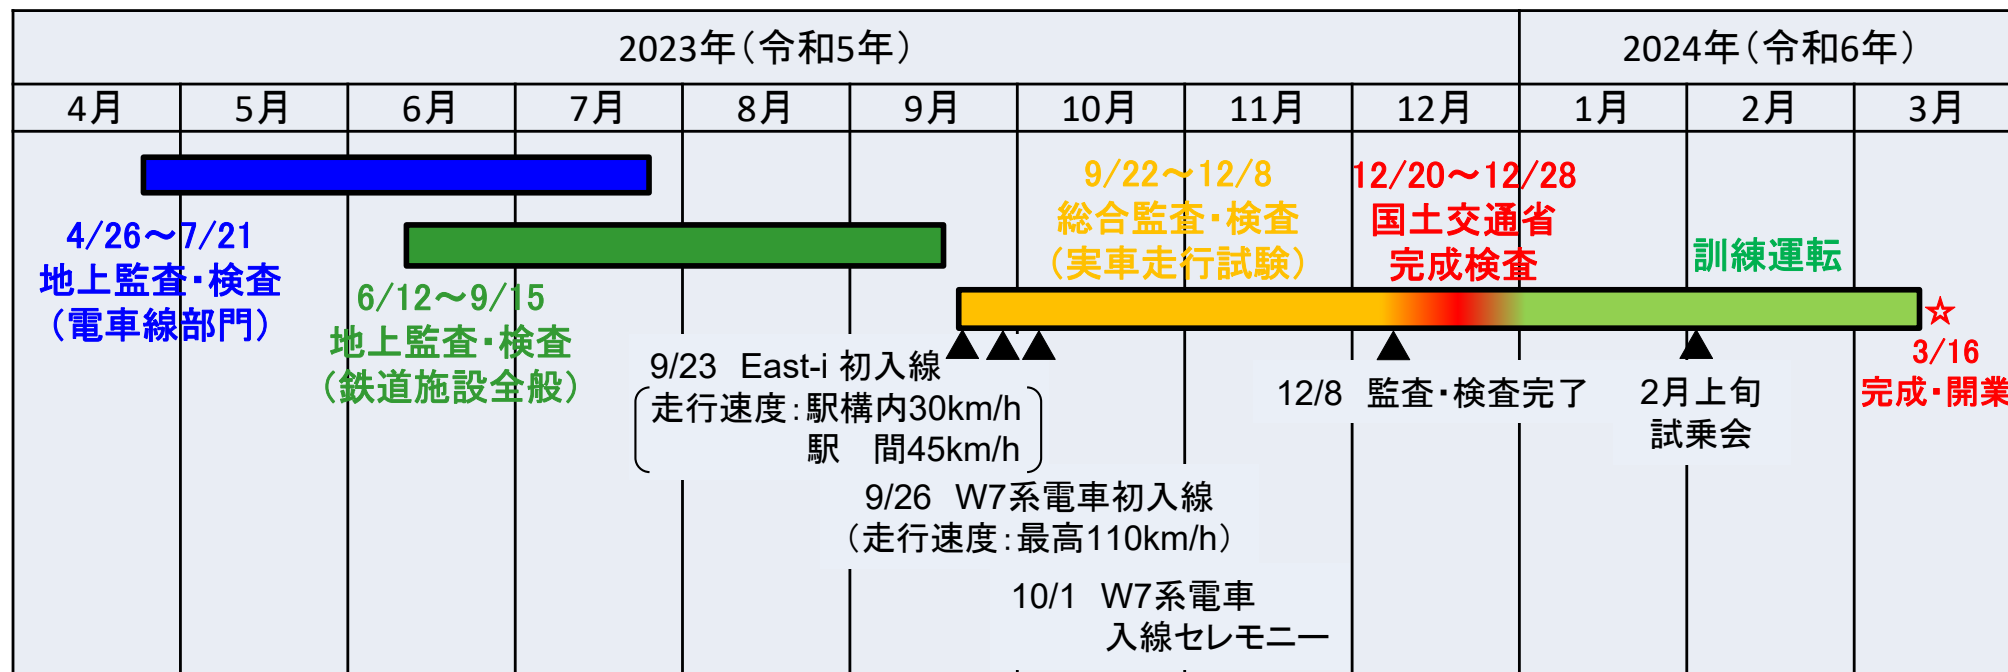

- 工事しゅん功監査(機構実施)・設備検査(JR西日本実施):
設備のできばえ、整備状態、各種基準との照合等について確認する。
- 地上監査・検査 : 実車走行前に行う鉄道施設の確認
- 総合監査・総合検査 : 実車を使用した試験

※以下はJR西日本主体で実施する項目

- 完成検査 : 国土交通省が鉄道事業者(JR西日本)に対して実施する検査
(変電所等の電気設備については、上記日程とは別に実施)
- 訓練運転 : JR西日本が乗務員習熟等のために実施する試運転

■ 実車走行試験スケジュール

試験項目	期間
入線架線試験	9月23日~9月29日
ホーム測定試験	10月2日~10月4日
ATC現示試験	10月7日~10月30日 12月6日~12月7日
列車無線試験	10月23日~10月24日
速度向上試験	11月1日~11月24日
総合コントロールラン試験	11月30日~12月1日
軌道検測	12月2日~12月3日

北陸新幹線 金沢・敦賀間 事業費総額の状況 (R5.11月末時点)

億円

2,500

1か月間の支払・契約実績を反映し、前月からの変更を対比

認可額を割振ったものが目標額である。
支払済額、契約済額、契約見込額、リスク対応額の合計が目標額と同額であるため、認可額の範囲内である。

2,000

1,500

1,000

500

0

用地取得

小松鉄道建設所

加賀鉄道建設所

あわら鉄道建設所

福井鉄道建設所

越前鉄道建設所

敦賀鉄道建設所

軌道工事

建築工事

機械工事

電力・電車線・変電工事

信号・通信工事

JR委託工事

工事補償・環境対策

支障移転等

工事附带

その他

■ 目標額

■ 支払済額

■ 契約済額

■ 契約見込額


■ リスク対応額

■ 支払済額(前回時点)

■ 契約済額(前回時点)

■ 契約見込額(前回時点)

■ リスク対応額(前回時点)

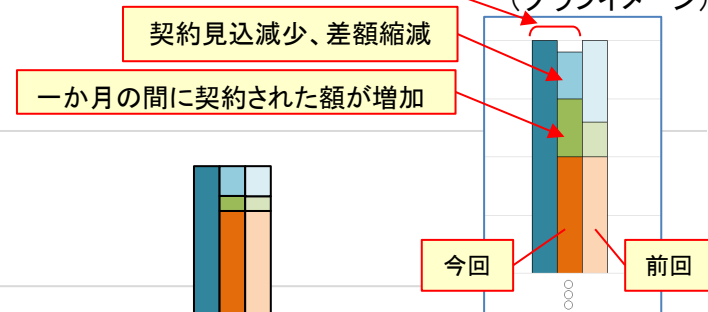

リスク管理表

	リスク	発現しているリスク	対応状況
工 事	気象変化、自然災害、他地域における自然災害への対応	—	—
	予期せぬ地質条件変化への対応	加賀トンネルの対策工実施箇所の経過観察	<ul style="list-style-type: none"> ・加賀トンネル盤ぶくれ対策について、トンネル全線で経過観察を実施している。 ・令和3年11月に計測を整理した結果、現時点では追加の対策は不要であり、軌道工事に着手しても問題ないと判断した。 ・令和3年10月29日の計測時に、2箇所で1mm未満の新規クラックが確認された。当該箇所は、水準測量等の計測結果から現時点で明確な隆起が見られていないため、軌道工事を継続することに影響はない。 ・経過観察で隆起傾向の連続性は確認されていないことから、令和5年10月25日に開催された有識者からなるトンネル施工技術特別委員会にて追加対策工は不要との結論を得た。
	物価上昇への対応	—	—
	作業員・資機材不足への対応	—	—
	新型コロナへの対応	—	— (※)
	法令変更への対応	—	—
	関係機関への対応	—	—
	施工計画変更への対応	—	—
	労働災害に関する対応	—	—
	公衆災害に関する対応	—	—
	トラブルに関する対応	—	—
	その他リスク要因となり得る懸念事項	—	—

※新型コロナへの対応については、R5.5.8付で感染症法上の分類が「5類」に引き下げられたことから、工程へのリスクが発現した場合の報告に変更。

現在も継続して対応しているリスク及び令和5年10月以降に発現したリスクを記載

：前回までの報告内容
