


○令和6年4月22日に岩塊に遭遇し掘削停止して以降、地上からの岩塊撤去作業と、シールドマシンで掘削可能かの確認を行いながらシールドマシンを進めておりましたが、令和7年7月1日に区間A①を通過し、中間立坑に到達しました。  
 ○今後、中間立坑においてシールドマシンのビット交換作業を行い、来春頃再発進の予定です。

- 凡例
- 岩塊存在区間
  - 岩塊の有無を判定するための地上からのボーリング(9区間)
  - 現時点で掘進が不可能となる岩塊は確認されていないが、岩塊が存在する可能性がある区間



注1: 地上から岩塊撤去中  
 注2: 到達立坑から撤去予定

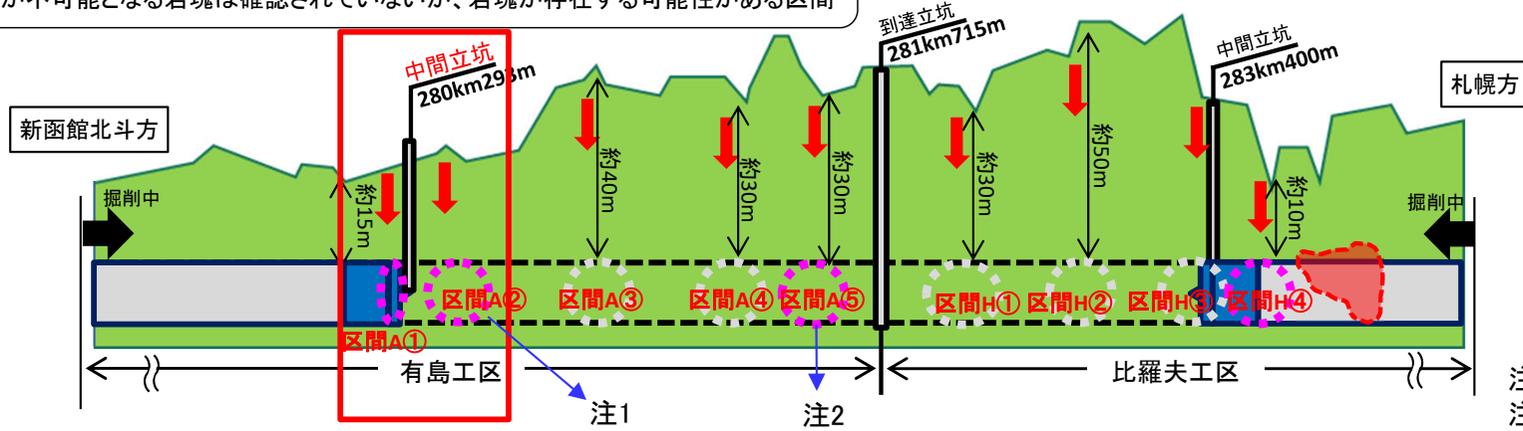
