


# 対策土受入地のモニタリング結果 <長万部町共立地区C>



# 対策土受入地のモニタリング結果 <長万部町共立地区C>

## ○ モニタリング結果(地下水)

### 発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・カドミウム・ふっ素の濃度の推移

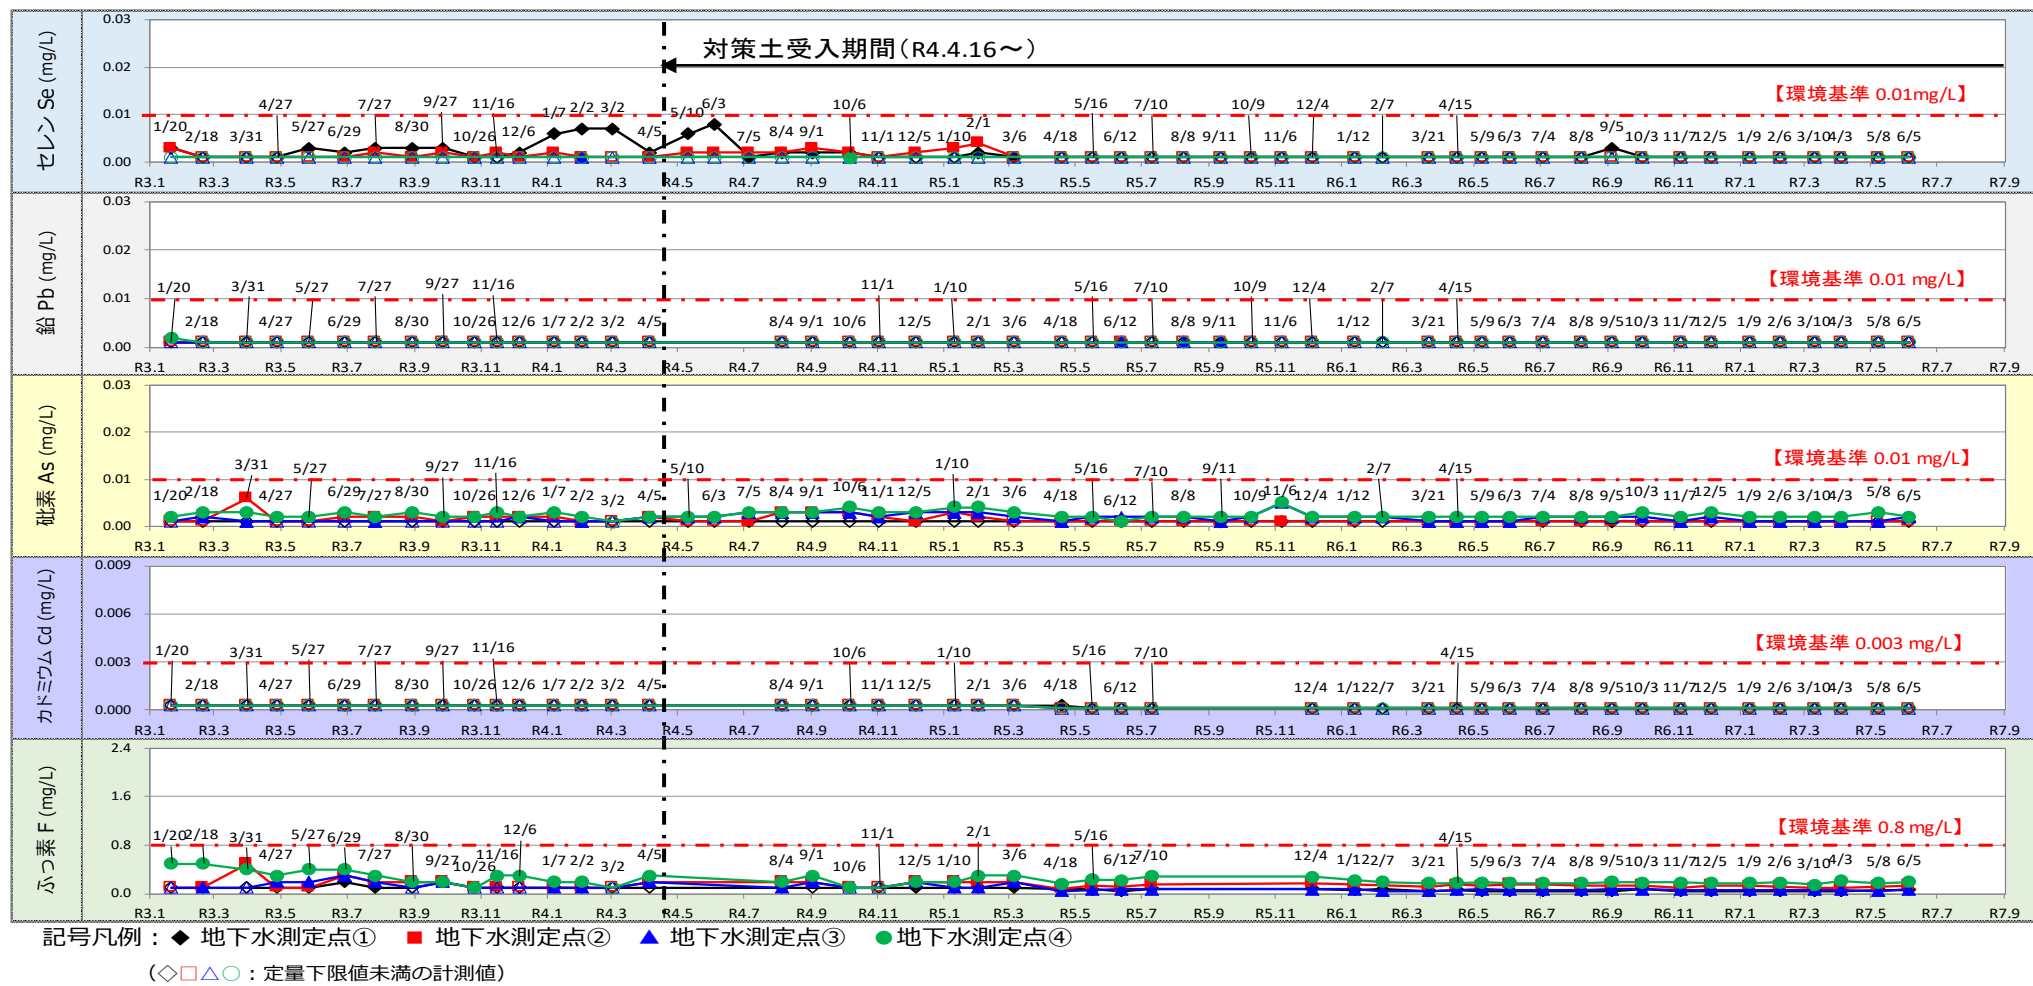


※定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・鉛・砒素:0.001mg/L、カドミウム:0.0003mg/L、ふっ素:0.08mg/L)として記載しています。

※R4.7より鉛を含む対策土の受入れを開始したため、R4.8から受入期間中のモニタリング項目に鉛を追加しました。

※R5.8～R5.11の間、カドミウムとふっ素が欠測しております。その前後の測定値から異常は発生していないものと想定しております。

## ○ モニタリング結果（河川水）

## 発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・カドミウム・ふっ素の濃度の推移

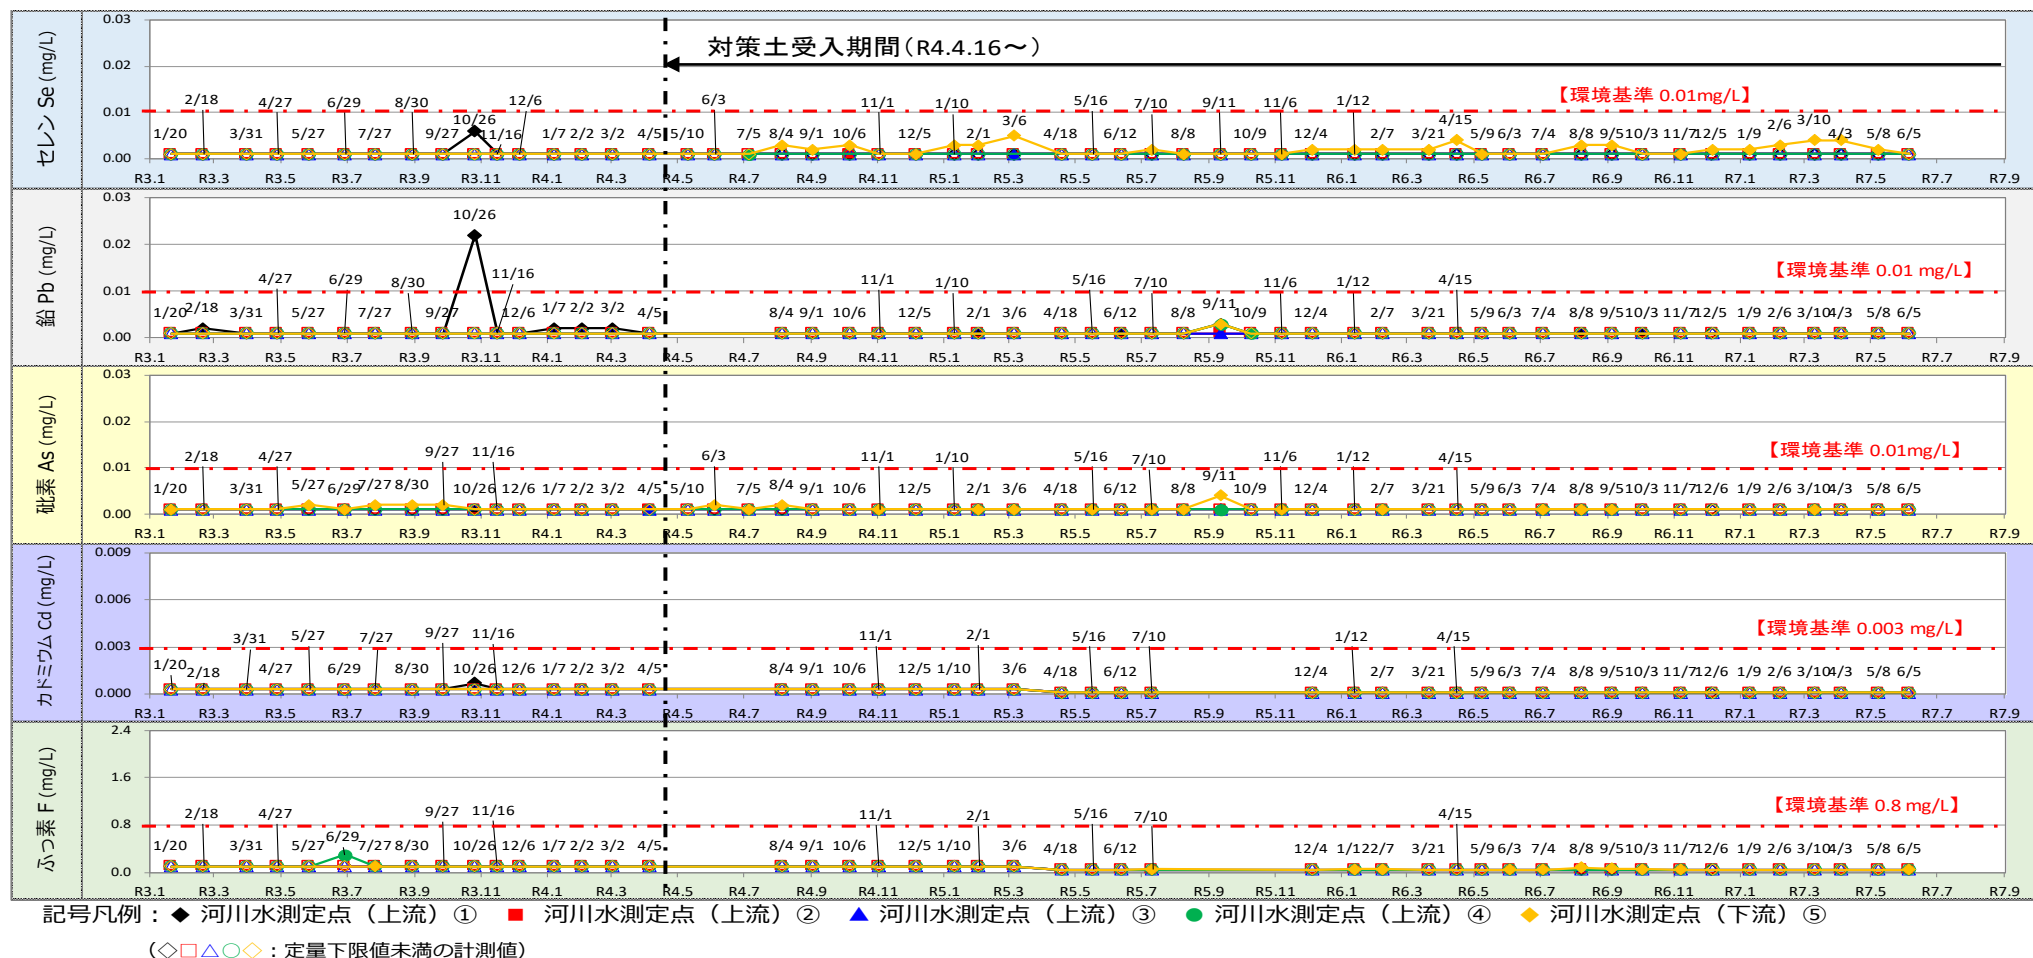

※定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・鉛・砒素:0.001mg/L、カドミウム:0.0003mg/L、ふっ素:0.08mg/L)として記載しています。

※R3.10.26に鉛の計測結果が基準値を超過していますが、対策土搬入前のため、対策土による影響ではございません。

※R4.7より鉛を含む対策土の受入れを開始したため、R4.8から受入期間中のモニタリング項目に鉛を追加しました。

※R5.8～R5.11の間、カドミウムとふっ素が欠測しております。その前後の測定値から異常は発生していないものと想定しております。

※グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを表すものです。
